



ЭТАЛОН

ИННОВАЦИЯ

ВНЕДРЕННОЕ новшество обеспечивающее
качественный рост **ЭФФЕКТИВНОСТИ** процессов

(wikipedia)



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

480

**почему мы управляем проектом
и процессами БКАД через ЭТАЛОН ?
в чем инновация?**



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

- ✓ 83 субъекта
- ✓ 3 181 пользователь
- ✓ 50 455 задач на контроле
- ✓ 15 041 объект контроля
- ✓ 563 млрд.руб на контроле
- ✓ 26 074 отчетов кураторов
- ✓ 4 269 обращений граждан
- ✓ 1 650 подрядных организаций



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

2016 год



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

С ЧЕМ СТОЛКНУЛИСЬ ...



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

Excel и качество **информационной** основы деятельности МТ и ФДА ...

2016 год



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

**НИЗКАЯ СКОРОСТЬ И
НЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ...**

2016 год



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

Минтранс РФ + **Субъект РФ** = **7 - 10 дней**
3 дня 1-2 дня - регистрация

1 день - рассмотрение на 1 уровне
Губернатор / Председатель
зам.Председателя
министр
зам.министра
нач. отдела / зам.нач. отдела
специалист

2016 год




БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН


ЧТО ДЕЛАТЬ?

изобретать или ехать?

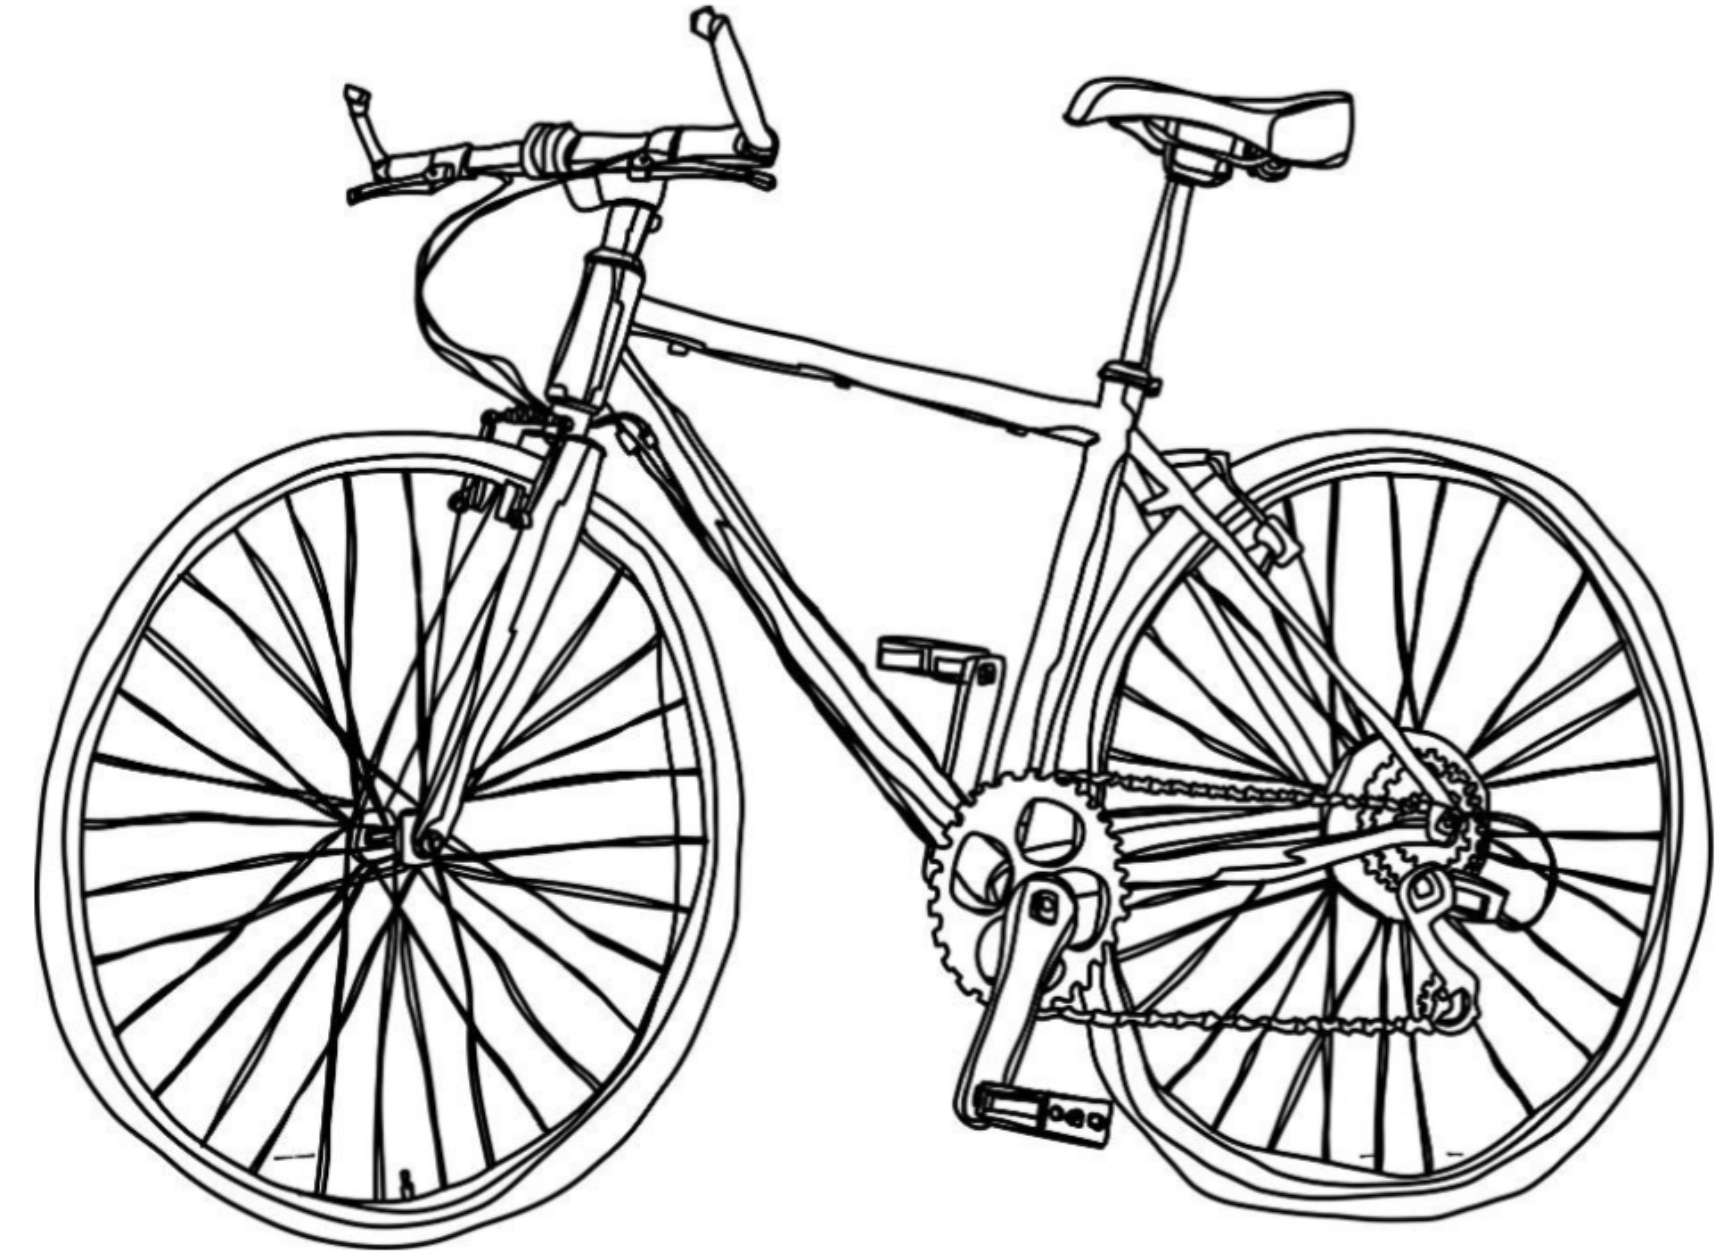



ЭТАЛОН

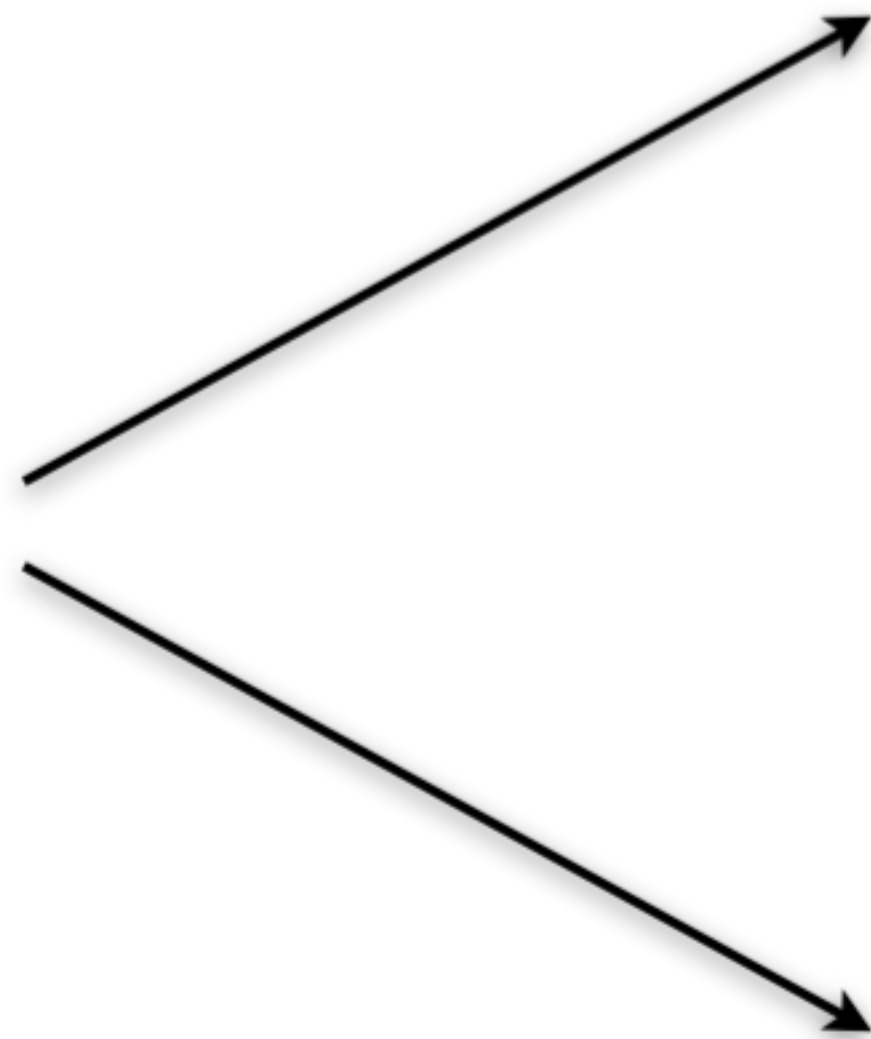

ПС ЕИАС
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
АСУ РОСАВТОДОРА



**БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ**



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ГОТОВОЕ решение + конфигурирование

(входит в реестр отечественного ПО)

Ситуационный центр

(сбор и визуализация достоверной управленческой отчетности)

- автоматический сбор первичных и агрегированных данных из других систем
- визуализация и контроль показателей по всем направлениям деятельности
- формирование единого достоверного информационного пространства
- конфигурирование общих и индивидуальных рабочих столов
- анализ показателей с помощью различных инструментов
- экспорт данных

Контроль

объектов, контрактов и подрядчиков

- ведение единого паспорта объекта
- сводный план работ
- контроль финансирования
- управление контрактами
- контроль исполнения
- интеграция с С Бухгалтерия и др.
- управление рисками
- строительный контроль
- общественный контроль
- формирование и согласование КС
- электронное взаимодействие с подрядчиком

Оперативное управление

проектное, процессное + ручное управление

- проектное управление
- процессное управление
- связь с целевыми показателями
- связь с объектами и контрактами
- учет поступлений
- администрирование и контроль исполнения
- планирование
- анализ исполнительской дисциплины
- планшетная версия
- мобильное приложение

Администрирование процессов

- автоматизация регламентных процессов
- автоматизация процессов с использованием данных из разных систем
- автоматическое формирование показателей
- автоматизация процессов по выявлению рисков в режиме 24/7

Конструктор отчетов

- формирование OLAP кубов для конструирования отчетности «на местах»
- использование данных из систем
- автоматическое формирование OLAP
- работа на важном уровне повсеместно
- территориальное настраивание первичных и агрегированных данных из Системы
- конструктор отчетов

ВСЁ СДЕЛАНО БЕРИ И РАБОТАЙ

«COPY PAST»

Инвест.программы

(формирование и контроль)

- формирование проектов программ
- контроль за ходом исполнения программ
- связь: Программа - объект - контракт - работа - платеж

Мобильное приложение

- мобильное приложение для работы на iOS и Android
- весь базовый функционал для работы в любое время в любом месте*

Работа с обращениями

- учет и контроль за ходом работ по обращению заявителя
- привязка обращений к конкретному объекту
- «транспортная система» для доставки обращений до конечных исполнителей

Интеграции

- интеграция с финансовыми и учетными системами (1С, Парус, самописные)
- интеграция с внешними системами для обмена данными в автоматическом режиме



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕССЫ



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ




ЭТАЛОН

БЫЛО



СТАЛО

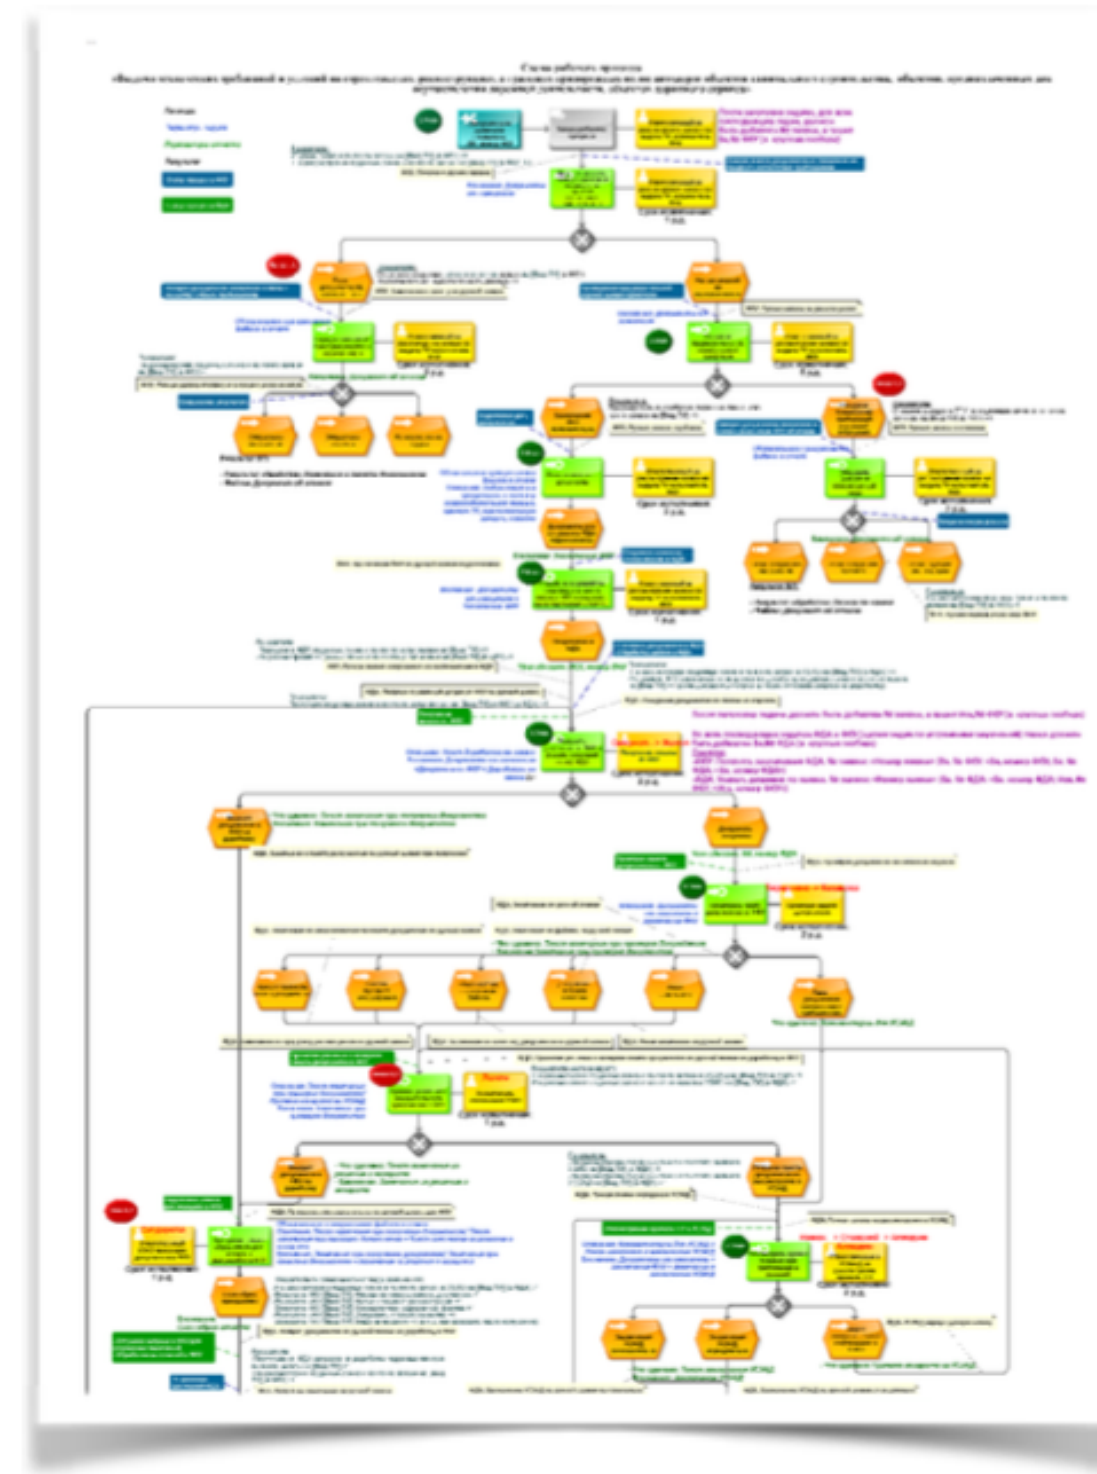

Рублевый счет	Сумма	Дата	Статус
Сбербанк-ОАО	45	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен
Сбербанк-ОАО	80	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен
Сбербанк-ОАО	111	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен
Сбербанк-ОАО	86	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен
Сбербанк-ОАО	8	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен
Сбербанк-ОАО	178	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен
Сбербанк-ОАО	176	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен
Сбербанк-ОАО	0	01.01.2019 - 31.12.2019	Активен



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕССЫ

СБОРА ДАННЫХ

АНАЛИЗА СИТУАЦИИ

ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ

КОММУНИКАЦИИ

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с ИСПОНИТЕЛЯМИ,

ПОДРЯДЧИКАМИ, ГРАЖДДАНАМИ

...



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ

+

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



Ситуационный центр | Оперативное управление | Документооборот | Контроль | Организация деятельности | Справочники | Целевые программы

ЭТАЛОН | Начните вводить для поиска | Область поиска | Задать вопрос | Администратор с.

Рабочий стол

.Самара | .Самара_агл | .Саратов | .Саратов_агл | .Саха (Якутия) | .Саха(Якутия)_агл | .Сахалин | .Сахалин_агл | .Севастополь | .Севастополь_агл | .Сев.Осетия-Алания | .Сев.Осетия-Алания

Самарская область | Дополнительные фильтры | за весь год | Обновить экран

Проблемы и обратная связь

Самара (рег. проблемы)	43
Самара Общ контроль + подрядчики	86

Паспорта объектов

Самара (Объекты 2017)	111
Самара (Объекты 2018)	86
Самара (Справочн.2018)	8
Самара (Объекты 2019)	178
Самара (Справочн.2019)	2

Задачи региональной группы

Самара (все задачи)	576
Самара (просрочка)	0
Самара (риски)	0

S-56 : Самарская область

01.01.2019 - 31.12.2019

Контракция объектов [Всего] 39 %

% законтрактованных объектов	39 %
Законтрактовано объектов	69 ед.
Количество объектов	176 ед.
Включено в план-график, объектов	176 ед.
% включенных в план-график объектов	100 %
Объявлены торги по объектам	176 ед.
% объявлены торги по объектам	100 %
Завершены торги по объектам	160 ед.
% завершены торги по объектам	91 %
Количество объектов без информации о торгах	0 ед.

Все объекты, кроме переходящих на след.год

01.01.2019 - 31.12.2019

Реализация объектов РП 0 %

% объектов РП, введенных в эксплуатацию	0 %
Количество объектов	174 ед.
Количество объектов, введенных в эксплуатац...	0 ед.
Количество объектов БКАД	173 ед.
Количество справочных объектов	1 ед.
% объектов БКАД, введенных в эксплуатацию	0 %
Протяженность дорог РП	221,97 км
Протяженность дороги, введенной в эксплуата...	0 км
Протяженность объектов БКАД	213,93 км
Протяженность объектов БКАД, введенных в э...	0 км
Протяженность справочных объектов	8,04 км
Протяженность справочных объектов, введенн...	0 км

S-56 : Самарская область

01.01.2019 - 31.12.2019

Освоение средств БКАД 1,7 %

% Оплаты от финансирования	1,7 %
Общее финансирование	4,71 млрд руб.
Контракты	469,97 млн руб.
План выполнения	1,12 млрд руб.
Выполнено	80,27 млн руб.
% Выполнения	7,15 %
Оплачено	80,27 млн руб.
% Оплаты от стоимости актов	100 %
Количество объектов	176 ед.

все объекты, кроме переходящих на след.год

01.01.2019 - 31.12.2019

Укладка А/Бетон и др. типов покрытий 3,28 %

% укладки верхнего слоя (кв.м)	3,28 %
Площадь дороги	2,16 млн кв.м
Верхний слой, кв/м (по проекту)	638,08 тыс. кв.м
Верхний слой, кв/м (ФАКТ)	70,85 тыс. кв.м

S-56 : Самарская область

01.01.2019 - 31.12.2019

Кассовое исполнение 100 %

% Оплаты от стоимости актов	100 %
Оплачено	80,27 млн руб.
Оплачено Федеральный бюджет	0 руб.
Оплачено (РБ+МБ)	80,27 млн руб.
Оплачено Региональный бюджет	72,56 млн руб.

S-56 : Самарская область





01.01.2019 - 31.12.2019

Общественный контроль

% запросов с ответом	
Всего запросов	48 ед.



сквозной контроль / «проваливание»

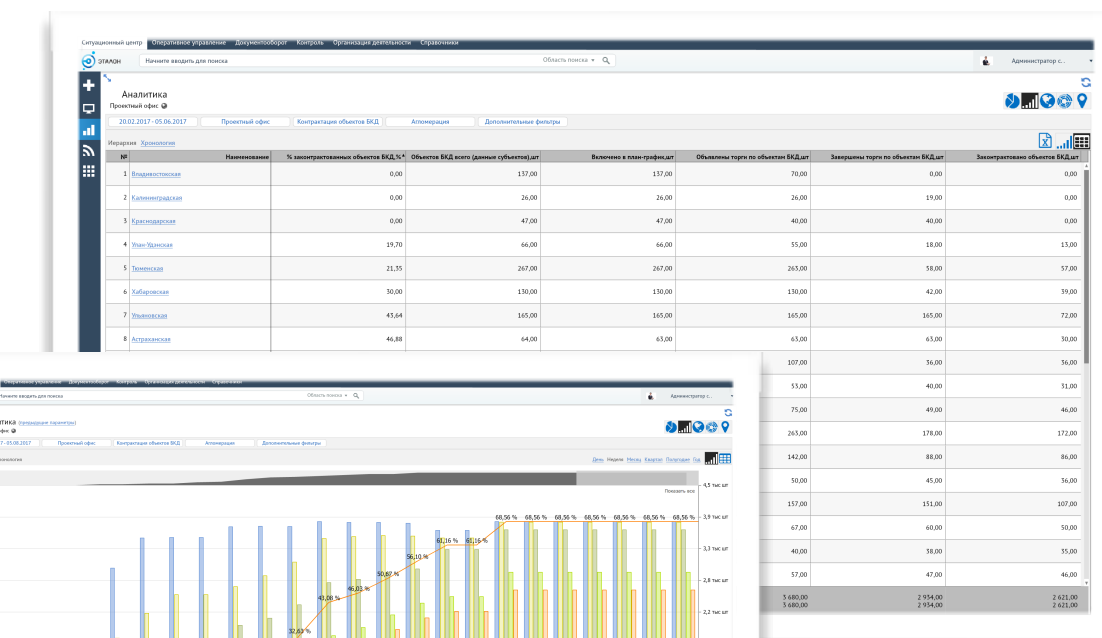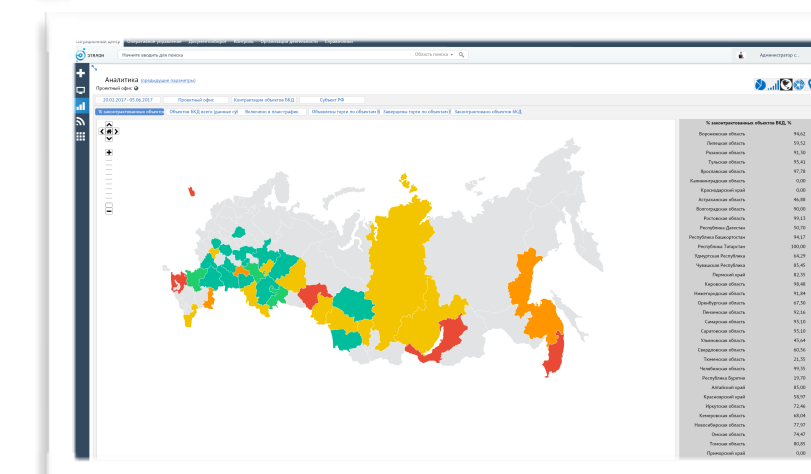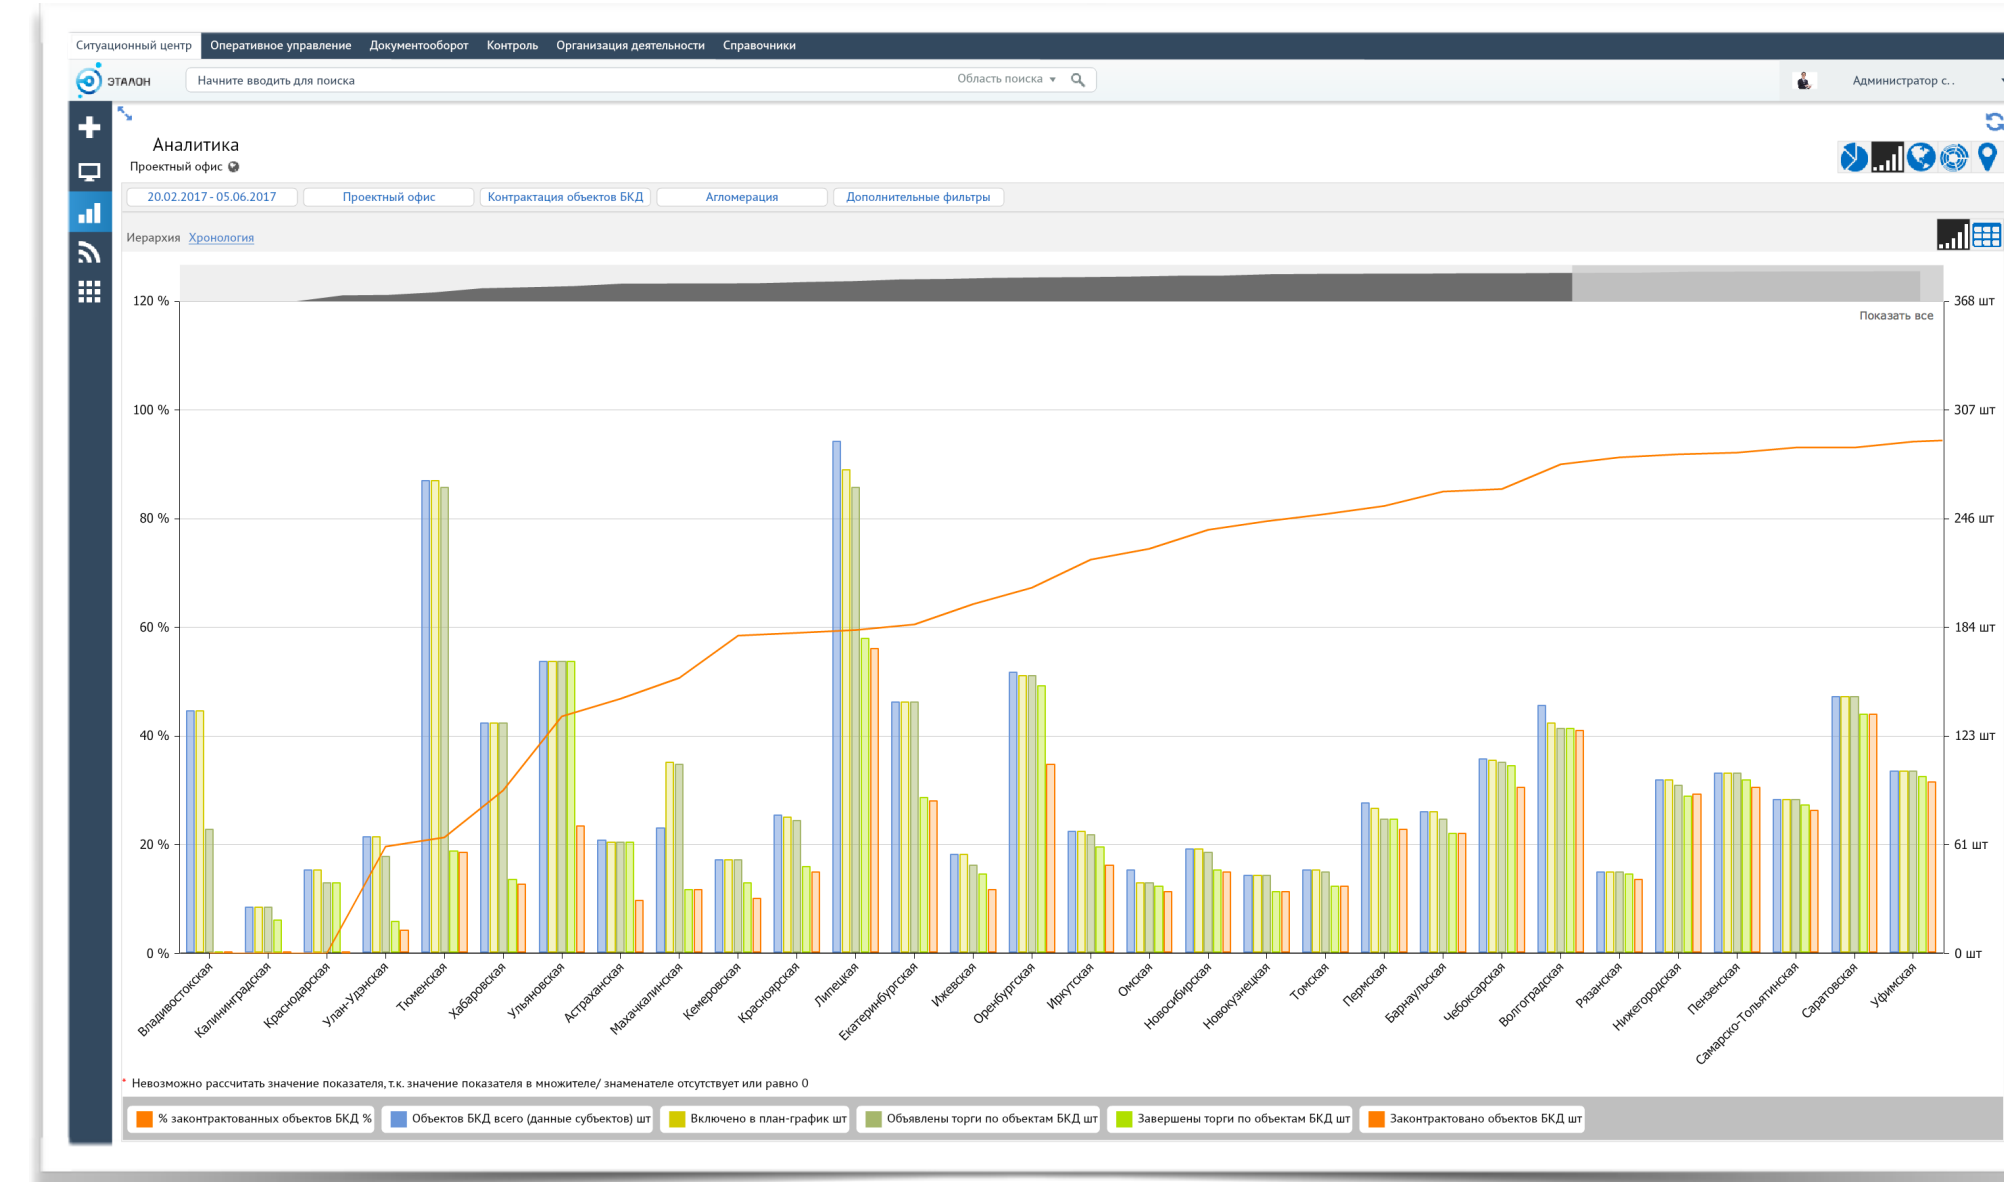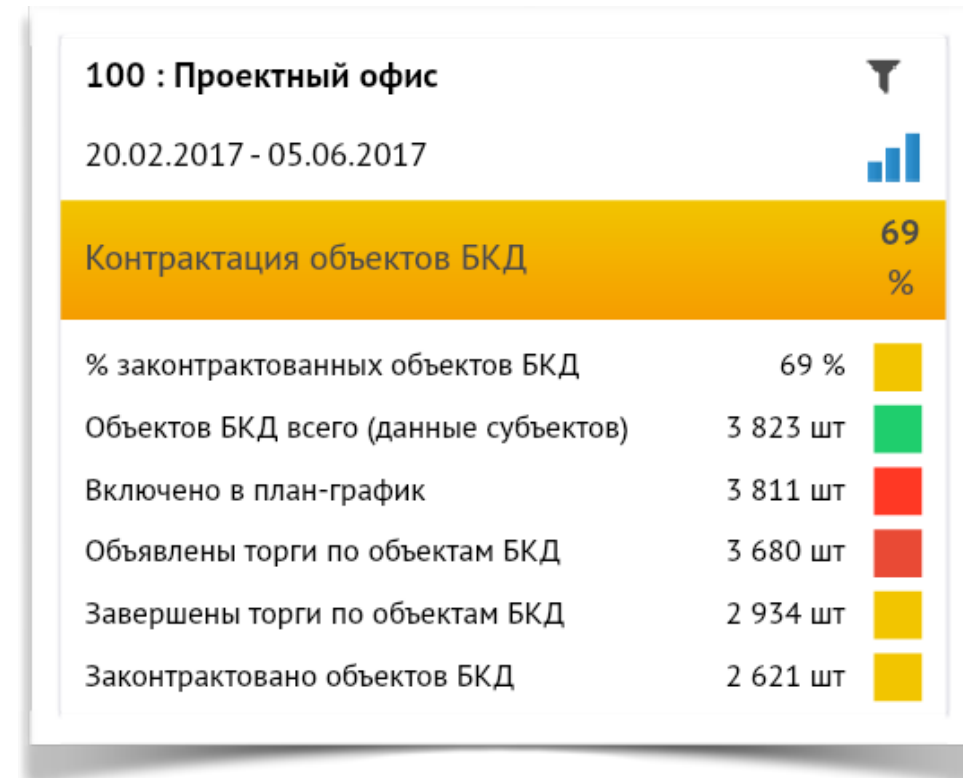

✓ контроль и аналитика на основе первичных данных

✓ возможность из агрегированных показателей «провалиться» до конкретного объекта / договора / платежа, муниципалитета / учреждения / подразделения / сотрудника



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ОБЪЕКТА

Паспорт
меропр

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100

- Основное
- Сведения о реализации
- Характеристики
- План
- Планы-графики
- Документы
- Контракты
- Претензионная работа
- Дневник куратора
- Стройконтроль
- Отчеты подрядчика

Код объекта:	021
Полное наименование:	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100
Характер работ:	Ремонт
Тип объекта контроля:	Дорожное строительство
Месторасположение объекта:	км 0+000 - км 7+100 а/д Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер
ОКТМО:	12000000 Муниципальные образования Астраханской области
Автомобильная дорога:	Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000-км 13+006
Значение объекта:	Регионального значения
Основание для начала работ:	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Астраханской агломерации"

7,07%

93,76%

100%

52,15%

0%

33,01%

98,77%

Редактировать



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ФИНАНСОВЫЙ

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100

- Основное
- Сведения о реализации
- Характеристики
- План
- Планы-графики
- Документы
- Контракты
- Претензионная работа
- Дневник куратора
- Стройконтроль
- Отчеты подрядчика

Ответственный: [Иванов Д. В.](#)
 Заказчик: [АО ГКУ "Астраханьавтодор"](#)
 Госэкспертиза утверждена: -
 Ген. подрядчик: [ООО "ВРСК"](#)
 Готовность: 93,76%
 Сроки выполнения: 08.05.2018 - 31.10.2018
 Стоимость: 64 151 006,1 руб.
 Статус работ: СМР
 Объект сдан: Нет
 Дата окончания гарантийного срока: 31.10.2022
 Справочный: Нет

▼ Статусы торгов по ОК

Включен в план-график торгов:	27.02.2018
Уникальный номер позиции плана-графика:	2018082520000180020000240006
Торги объявлены:	27.02.2018
Номер извещения об осуществлении закупки:	0825200001818000011
Торги завершены:	23.04.2018
Законтрактрован полностью:	08.05.2018

ПЛАН-ГРАФИК № 2018082520000180020001

Размещено 08.05.2018 17:07 (МСК (UTC+3) Москва, стандартное время)
по местному времени заказчика

Показать изменения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА	ПОЗИЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА	ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ	ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ДОКУМЕНТЫ	ЖУРНАЛ ВЕРСИЙ	ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
ОБЪЯСНЕНИЕ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПОЗИЦИИ	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ	ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАКУПКИ		

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Уникальный номер позиции плана-графика: 2018082520000180020000240006

Идентификационный код закупки (ИКС)	Год	Идентификационный код заказчика	Номер закупки в плане закупок	Номер закупки в плане-графике закупок	Код позиции КТРУ	Код вида расходов
18	23015095508301501001	0010	006	4211	244	

Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100 в Наримановском районе Астраханской области

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

Способ определения поставщика: Электронный аукцион

СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ И СРОКЕ ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Планируемый срок начала осуществления закупки: Февраль 2018

ЗАКУПКА №0825200001818000011 **ISS**

Размещено: 31.03.2018 12:34 (МСК+1 (UTC+4) Самара)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ДОКУМЕНТЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА | ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 31.03.2018 №ИИ/2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.sberbank-ast.ru>

Размещение осуществляет: Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ "АСТРАХАНЬАВТОДОР"

Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100 в Наримановском районе Астраханской области

Этап закупки: Определение поставщика завершено

Сведения о связи с позицией плана-графика: [2018082520000180020000240006](#)

Номер типового контракта, типовых условий контракта: Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ФИНАНСОВЫЙ

Контракт № 0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018 На исполнении

- Основное
- Обеспечение контракта
- Планы и выполнение
- Платежи
- Доп. соглашения
- Документы
- Связанные задачи
- Субподрядчики
- Настройки

Предмет контракта:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер
НМЦ контракта:	84 968 220 руб.
Стоимость контракта по результатам торгов:	64 151 006,1 руб.
Текущая стоимость контракта:	64 151 006,1 руб.
Реестровый номер с сайта госзакупок:	0825200001818000011
Номер контракта:	0825200001818000011-0402241-03
Дата подписания контракта:	08.05.2018
Контракт:	Прикрепленные файлы: 1
Период исполнения контракта:	08.05.2018 - 31.10.2018
НДС:	18 %
Коэффициент снижения:	0,755
Процент аванса:	15 %
Максимальная сумма аванса:	9 622 650,92 руб.
Ответственное лицо заказчика:	-
Исполнитель:	ООО "ВРСК"

Исполнить Расторгнуть Редактировать



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ФИНАНСОВЫЙ

Контракт № 0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018

КБК контракта: - Резерв на непредвиденные затраты: 0 руб.
 Стоимость: 64 151 006,1 руб. Выполнено непредвиденных работ: -
 Планируемое выполнение: 64 151 006,1 руб.
 Фактическое выполнение: 60 146 652,02 руб.

План	Акт	Платеж			
Период	Сумма	Дата	№	Сумма	Вид платежа
2018 Июнь	14 837 010,84	06.06.2018	1	14 837 010,84	Аванс
2018 Июнь	33 645 774,24	25.06.2018	2	33 645 774,24	Выполнение
2018 Июль	11 663 866,94	20.07.2018	3	11 663 866,94	Выполнение
2018 Октябрь	4 004 354,08				Выполнение
Итого:				64 151 006,1	60 634 720,21

Исполнить Расторгнуть Редактировать



ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100

И претензионная работа

Дневник куратора

Стройконтроль

Отчеты подрядчика

Финансирование

Мероприятия заказчика

Объект на карте

Контакты

Поручения руководителя

Решения штабов

Вопросы и проблемы

Веб-камера

Справка о посещениях | Журнал посещений | Журнал замечаний

Куратор: [Диденко Геннадий Васильевич](#)

Контракт №0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018 "Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер"

Подрядчик: [ООО "ВРСК"](#)

Дата и время последнего посещения: [20.07.2018 11:00](#)

Количество совершенных выездов: 2

Объект не посещался: 20 дн.

Работы ведутся: Нет

Темп работ: С опережением

Не устранено замечаний: 0

из них критичные: 0

истек срок устранения: 0

Общее количество замечаний: 1

ЗК-000003 Замечание куратора Устранено

Основное

История изменений

Объект контроля: [Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100](#)

Объект посетил: [Трушкин С. Н.](#)

Дата и время посещения объекта: [20.07.2018 11:00](#)

Подрядчик: [ООО "ВРСК"](#)

Контракт: [№0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018](#)

Суть замечания: Произвести ликвидацию колеиности на укрепленных обочинах, обеспечить дополнительную планировку обочин с последующим доуплотнением на км 0+000 км 5+000

Дата и время замечания: 20.07.2018 11:00

Устранить к: 10.08.2018 00:00

Дата и время фактического устранения: 26.07.2018 12:00

Предписание: -

Запись внес: [Трушкин С. Н.](#)

Прикрепленные файлы (2)

20180720_1145... 20180720_1145...

оперативный контроль ситуации на объекте кураторами



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ЕДИННЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ на всех уровнях

ЭТАЛОН

ДААННЫЕ для совещаний, отчетов, запросов

АП + ПРАВИТЕЛЬСТВО

МИНТРАНС

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

... ПОРТАЛЫ

АСУ ТК и СКДФ

УБИТЫЕ ДОРОГИ ОНФ, Региональные ябиды

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

... другие системы



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

Посещения объектов



Посещение 10.08.2018 18:34

Вид проверки	Внешняя проверка	Замечания	1
Проверка	Плановая	Не устранено	
Заказчик	ГКУ ЯО "Ярдорслужба" (7627013227)	всего	0
Объект	(а/д рег) Ремонт автомобильной дороги "Ярославль - Тутаев" - совхоз "Ярославка", км 0+021 км - 2+459 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	из них критичных	0
Контракт	№ ГК №934521 от 28.04.2018		
Предмет контракта	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Ярославль - Тутаев" - совхоз "Ярославка", км 0+021 - км 2+459, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области		
Объект посетил	Чупров К. В.		

[ПОДРОБНЕЕ](#) [СВЕРНУТЬ](#)

Посещение 10.08.2018 15:47

Вид проверки	Внешняя проверка	Замечания	3
Проверка	Плановая	Не устранено	
Заказчик	ГКУ ЯО "Ярдорслужба" (7627013227)	всего	0
Объект	(а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	из них критичных	0
Контракт	№ ГК №934521 от 28.04.2018		
Предмет контракта	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 - км 21+698, км 22+850 - км 27+904, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области		
Объект посетил	Чупров К. В.		

[ПОДРОБНЕЕ](#) [СВЕРНУТЬ](#)



Логин:

Пароль:

[Войти](#)



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

☰ Посещения объектов

Посещение 10.08.2018 15:47

Заказчик: ГКУ ЯО "Ярдорслужба" (7627013227)

ОСНОВНОЕ

ЗАМЕЧАНИЯ



ПОРТАЛ
ПОДРЯДЧИКА

Логин:

Пароль:

Войти

Замечание ЗК-000056 от 10.08.2018 15:47

Устранено

2. На протяжении участка наблюдается занижение обочин местами до 10 см, которое не обозначено ТСОДД.

Объект (а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

Срок устранения 14.08.2018 04:00

Замечание ЗК-000055 от 10.08.2018 15:47

Устранено

1. Не убирается проезжая часть от пыли и грязи после выполнения дорожных работ по фрезерованию.

Объект (а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

Срок устранения 14.08.2018 04:00

Замечание ЗК-000057 от 10.08.2018 15:47

Устранено

3. Обочины досыпаются растительным грунтом до кромки асфальта.

Объект (а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

Срок устранения 14.08.2018 04:00



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



Ситуационный центр | Оперативное управление | Документооборот | Контроль | Организация деятельности | Справочники

ЭТАЛОН | Начните вводить для поиска | Область поиска | Задать вопрос | Администратор с.

Рабочий стол

.Нижегородская_агл | .Новгородская обл | .Новгородская_агл | .Новосибирск | .Новосибирская_агл | .Омск | .Омская_агл | .Оренбург | .Оренбургская_агл | .Орловская обл | .Орловская_агл | **.Пенза** | V

Пензенская область | Дополнительные фильтры | за весь год

ЗНАТЬ НЕ ДОСТАТОЧНО, НАДО ЕЩЕ И ДЕЛАТЬ

Проблемы и обратная связь

- Пенза (рег. проблемы)
- Пенза Общ контроль + подрядчики

Паспорта объектов

- Пенза (Объекты 2017) 129
- Пенза (Объекты 2018) 21
- Пенза (Объекты 2019) 1
- Пенза (Справочн.2019) 1

Задачи региональной группы

- Пенза (все задачи) 891
- Пенза (просрочка) 0
- Пенза (риски) 0

Комментарии

S-55 : Пензенская область
01.01.2019 - 31.12.2019

Количество объектов	172 ед.	0 %
Законтраковано объектов	0 ед.	0 %
Включено в план-график, объектов	172 ед.	100 %
% включенных в план-график объектов	100 %	
Площадь дороги	1,05 млн кв.м	
Верхний слой, кв/м (по проекту)	1,05 млн кв.м	
Верхний слой, кв/м (ФАКТ)	0 кв.м	
% укладки верхнего слоя (тн)	0 %	
Верхний слой, тн (по проекту)	121,51 тыс. тн	

Все объекты, кроме переходящих на след. год
01.01.2019 - 31.12.2019

Количество объектов	172 ед.	0 %
Количество объектов, введенных в эксплуата...	0 ед.	0 %
Количество объектов БКД	171 ед.	
Количество справочных объектов	1 ед.	
Протяженность объектов БКАД, введенных в эксплуац...	39 км	
Протяженность объектов БКД, введенных в эксплуац...	39 км	
Протяженность справочных объектов, введенных в...	0,22 км	

S-55 : Пензенская область
01.01.2019 - 31.12.2019

Общее финансирование	1,46 млрд руб.	0 %
Контракты	0 руб.	0 %
План выполнения	0 руб.	0 %
Выполнено	0 руб.	0 %
Оплачено	0 руб.	0 %
Оплачено Федеральный бюджет	0 руб.	0 %
Оплачено (РБ+МБ)	0 руб.	0 %
Оплачено Региональный бюджет	0 руб.	0 %
Оплачено Внебюджетные источники	0 руб.	0 %
Оплачено Местный бюджет	0 руб.	0 %

Показатели протяженности

- Доля а/д РМЗ в нормативе
- 1. Доля а/д рег.значения
- Протяженность а/д РМЗ
- Протяженность а/д РМЗ

Выполнение показателя

- Снижение кол-ва мест концентрации
- Снижение кол-ва мест концентрации
- Кол-во мест концентрации
- Кол-во мест концентрации
- Кол-во мест ДТП на нач...

Кассовое исполнение
01.01.2019 - 31.12.2019

% Оплаты от стоимости актов	0 руб.	0 %
Оплачено	0 руб.	0 %
Оплачено Федеральный бюджет	0 руб.	0 %
Оплачено (РБ+МБ)	0 руб.	0 %
Оплачено Региональный бюджет	0 руб.	0 %
Оплачено Внебюджетные источники	0 руб.	0 %
Оплачено Местный бюджет	0 руб.	0 %

Общественный контроль

% запросов с ответом		
Всего запросов		
Ответов по запросам		
Запросы без ответа		

Укладка А/Бетон и др. типов покрытий
01.01.2019 - 31.12.2019

% укладки верхнего слоя (кв.м)	0 %
--------------------------------	-----



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

2016 год



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

Проблемы на уровне региональных и муниципальных команд ...

2016 год



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН


ЭТАЛОН хорошая ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ежегодный маршрут

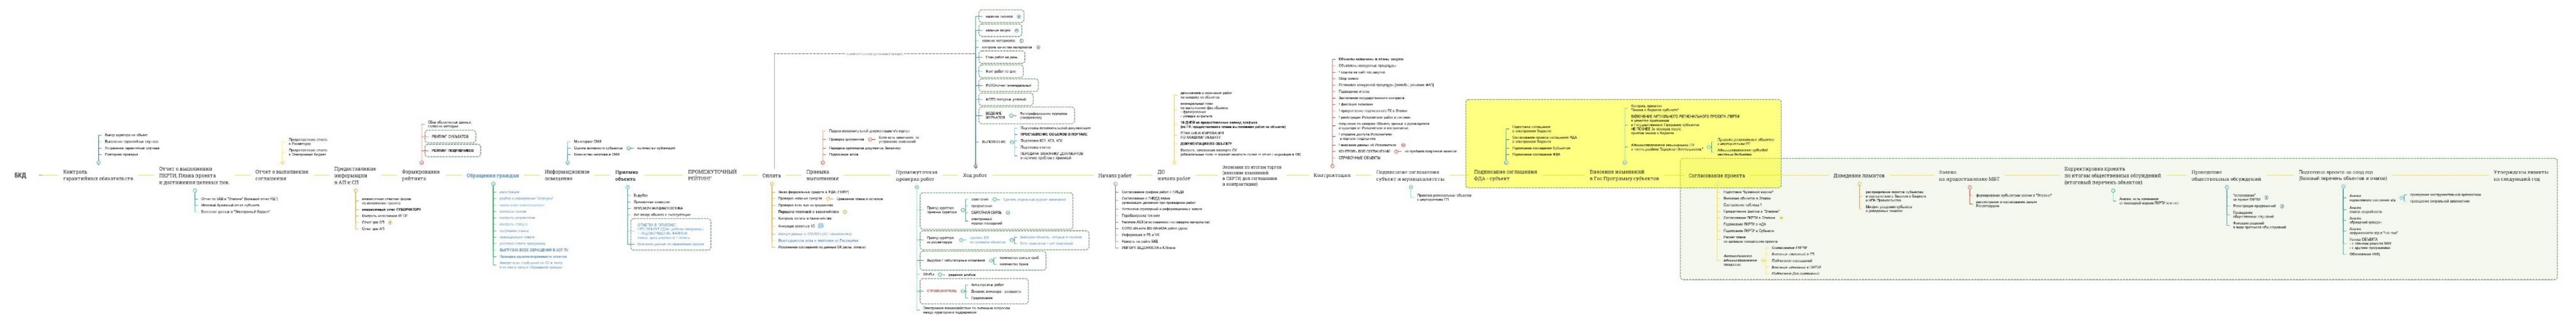

за 2 года мы вывели каждый шаг на маршруте
и знаем что вас ждёт, какие будут проблемы и как их решать



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В КОТОРОЙ СТРУКТУРИРОВАНЫ ВСЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА





БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ВАЖНО

**выявлять риски и тенденции,
и оперативно их отрабатывать**
а не решать проблемы



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

МОЖНО НА АВТОМАТЕ?



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ




ЭТАЛОН

ЗНАНИЯ И ОПЫТ В АВТОМАТ

/ В АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВЫХ ПОМОЩНИКОВ

+ Искусственный Интеллект

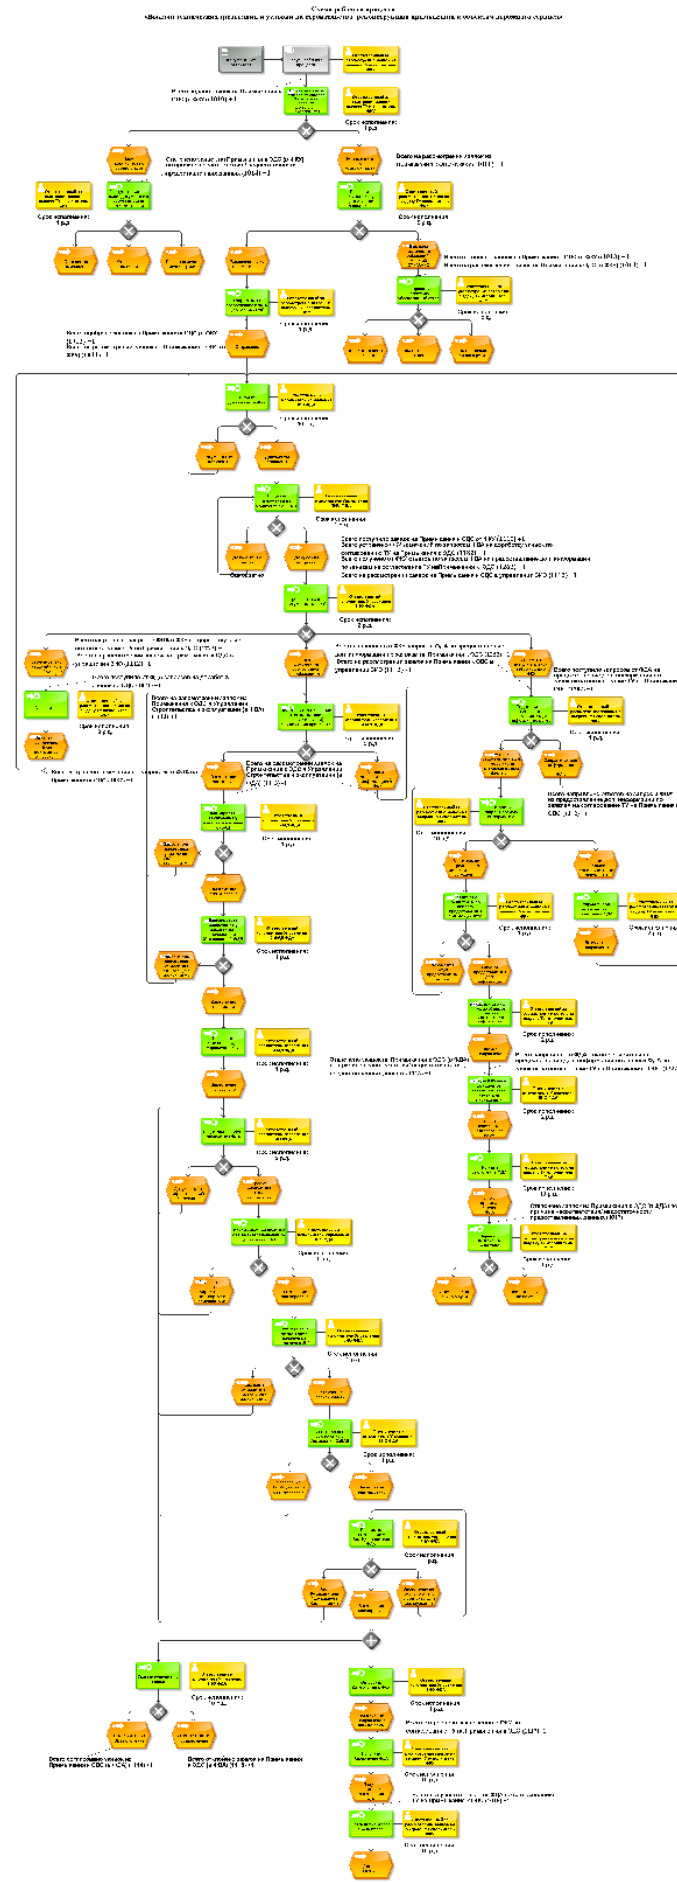

Автоматическое администрирование процессов

Автоматическое формирование показателей

Гибкость и скорость изменения процессов и управления
(нет необходимости переучивать всех сотрудников)

Автоматический мониторинг показателей
и поиск отклонений для запуска процессов
(реагирования на отклонения)

Масштабируемость и повышения эффективности
за счет перевода опыта работы лучших сотрудников
в процессы и их применения на всех объектах



ВАЖНО не только
УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ
но и **ОТРАБОТАТЬ ЕЁ**
НА ОПЕРЕЖЕНИИ




БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ПОЧЕМУ У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ?

изобретать или ехать?

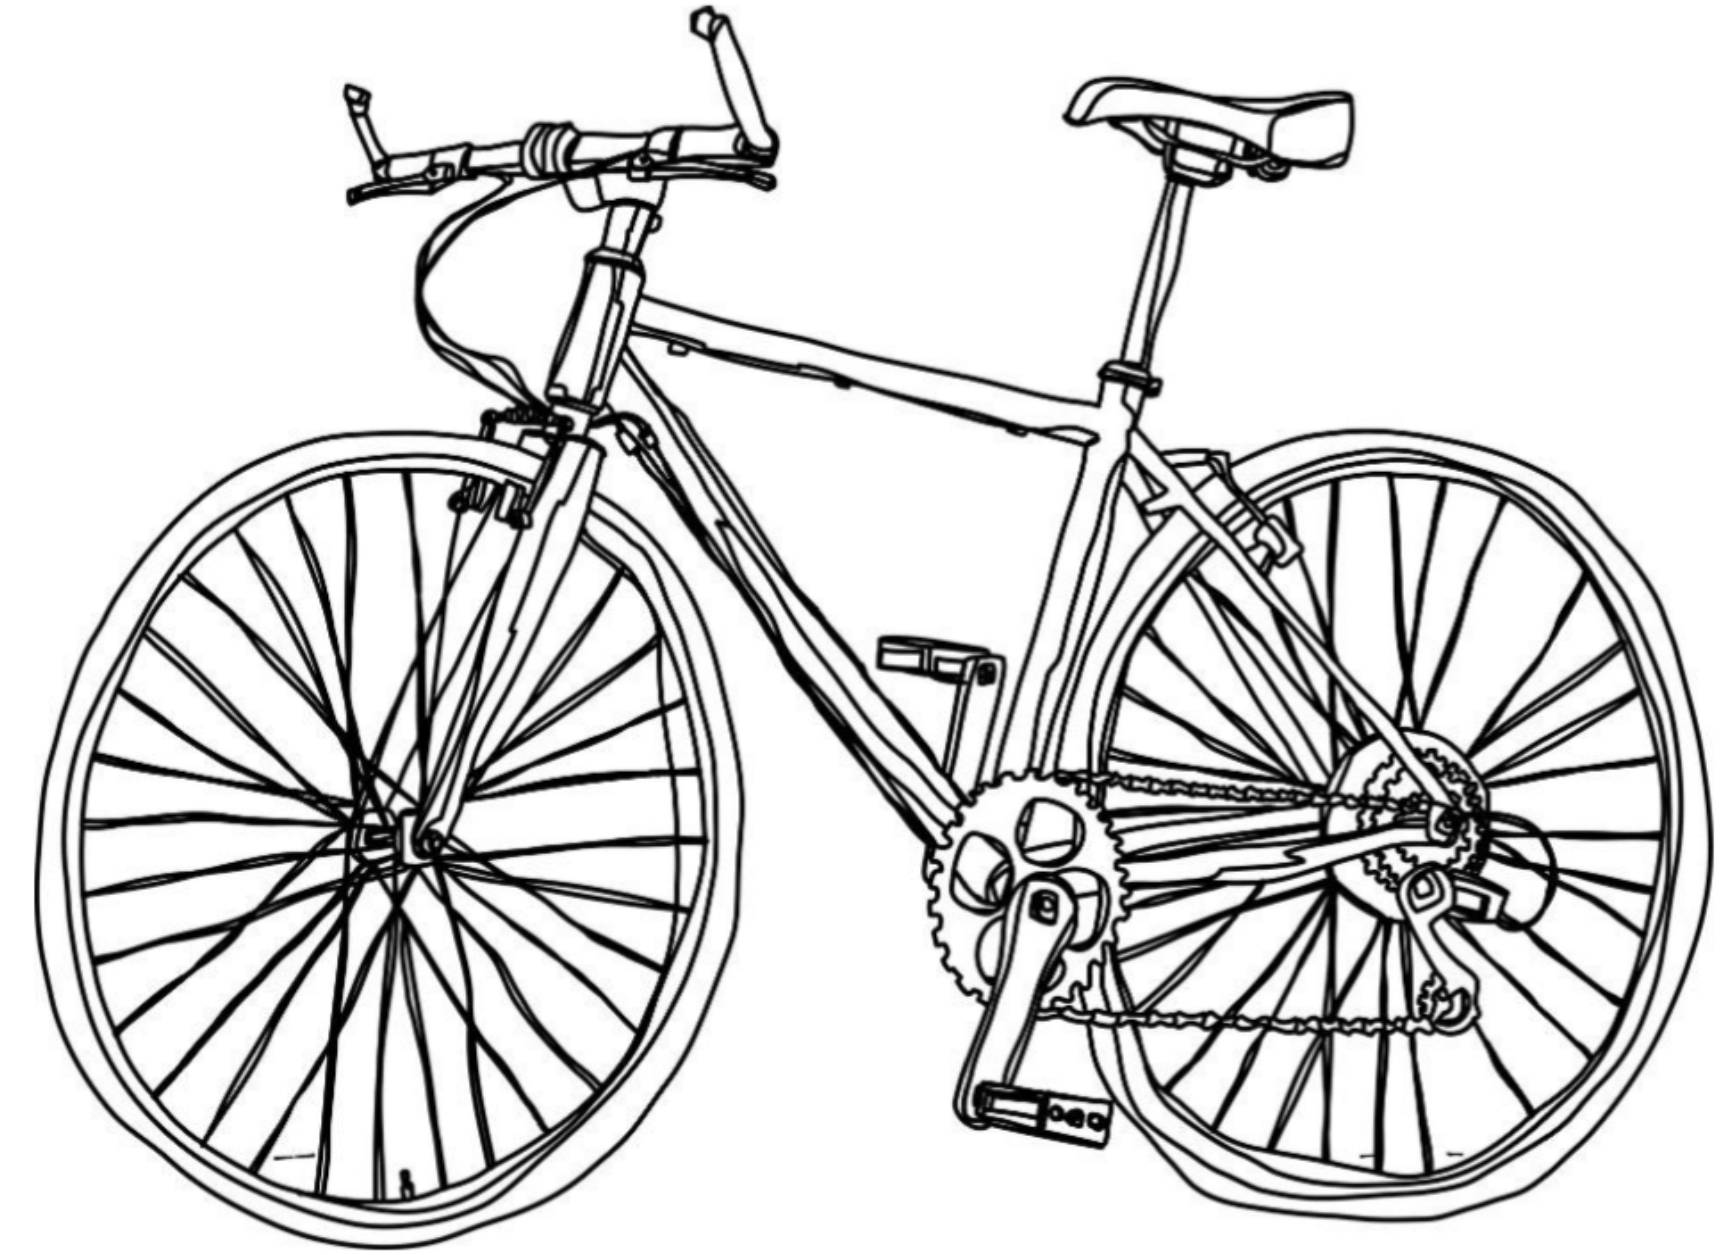

ЭТАЛОН



ОБЪЕДИНИЛИ
ЛЮДЕЙ
ПРОЦЕССЫ
СИСТЕМЫ

ДАННЫЕ для совещаний, отчетов, запросов
АП - УРАВИЛЬСКОЕ
МИНТРАНС
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
... ПОРТАЛЫ
АСУ ТК и ОНФ
УБИТЫЕ ДОРОГИ ОНФ, Региональные ябиды
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
... другие системы

ИННОВАЦИЯ

ВНЕДРЕННОЕ новшество обеспечивающее
качественный рост **ЭФФЕКТИВНОСТИ** процессов

(wikipedia)



ЭТАЛОН

**ВНЕДРЕНИЕ ЭТАЛОНА
обеспечило рост ЭФФЕКТИВНОСТИ
и ПРОЗРАЧНОСТИ процессов**



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ




ЭТАЛОН

БЫЛО



СТАЛО

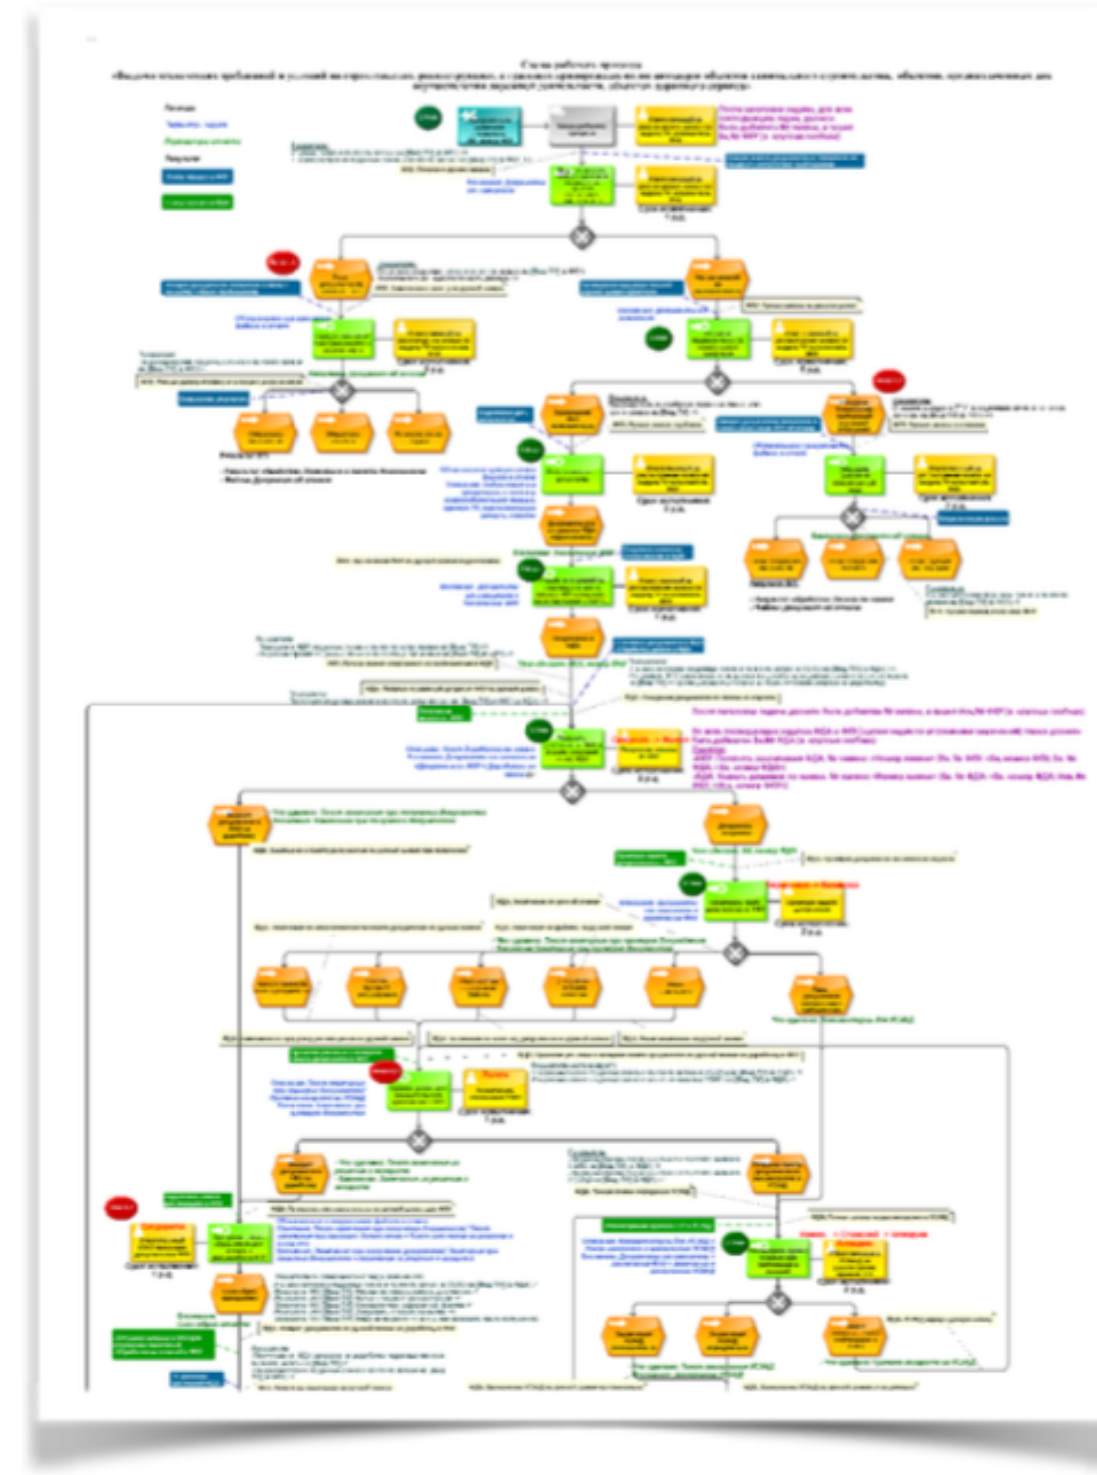

№	Наименование	Ссылка	Статус	Дата	Исполнитель	Комментарий
1	Создание плана
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№	Наименование	Ссылка	Статус	Дата	Исполнитель	Комментарий
1	Создание плана
2
3
4
5
6
7
8
9
10



ЭТАЛОН



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

(субъекты на старте)

НЕТ ВРЕМЕНИ

НЕТ ДАННЫХ /ПРИХОДИТСЯ ВЕРИТЬ «НА СЛОВО»

ПОНЯТИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Я С НИХ ТРИ ШКУРЫ СПУЩУ

РАЗВЕ ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО ...

ВСЕ ВРУТ

ВСЕ ОБЕЩАЮТ ИСПРАВИТЬСЯ – И ОПЯТЬ ВРУТ

ОНИ НЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ

ОНИ ПОСЫЛАЮТ



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕХА



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ДЛЯ УСПЕХА:

У ВСЕХ ЕДИНОЕ ВИДЕНИЕ ЧТО ЕСТЬ И ЧТО БУДЕТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ЭТАЛОН

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАЧИ

+

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МОНИТОРИНГ

(не ленитесь реагировать на «сигналы» о работе ваших коллег)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

ВНИМАНИЕ КОМАНДЕ



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

ЧЕМ ПОМОГАЕТ ЭТАЛОН

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ТОМ ЧТО У ВАС ПРОИСХОДИТ

РАБОЧИЙ СТОЛ + ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА + СВЕТОФОР

СЛЕДОВАТЬ ЗАДАЧАМ и ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН

БЫСТРАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ «ЧТО и ГДЕ идёт НЕ ТАК»

БЫСТРЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЕДИНАЯ и ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА для всех участников

МЕНЬШЕ ОТЧЕТОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ + ЭКСПОРТ В ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭСКАЛАЦИИ ПРОБЛЕМ и «ЗАВИСШИХ ВОПРОСОВ»

и требовать их решения

ФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС для РЕГУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

руководителя и исполнителя

Ситуационный центр

(сбор и визуализация достоверной управленческой отчетности)

- автоматический сбор первичных и агрегированных данных из других систем
- визуализация и контроль показателей по всем направлениям деятельности
- формирование единого достоверного информационного пространства
- конфигурирование общих и индивидуальных рабочих столов
- анализ показателей с помощью различных инструментов
- экспорт данных

Контроль

объектов, контрактов и подрядчиков

- ведение единого паспорта объекта
- сводный план работ
- контроль финансирования
- управление контрактами
- контроль исполнения

Оперативное управление

проектное, процессное + ручное управление

- проектное управление
- процессное управление
- связь с целевыми показателями
- связь с объектами и контрактами
- учет поручений

Администрирование процессов

- автоматизация регламентных процессов
- автоматизация процессов с использованием данных из разных систем

Конструктор отчетов

- формирование OLAP кубов для конструирования отчетности «на местах» с использованием данных Системы

ВСЁ СДЕЛАНО БЕРИ И РАБОТАЙ

Инвест.программы

(формирование и контроль)

- формирование проектов программ
- контроль за ходом исполнения программ
- связь: Программа - объект - контракт - работа - платеж

Мобильное приложение

- мобильное приложение для работы на iOS и Android
- весь базовый функционал для работы в любое время в любом месте*

Работа с обращениями

- учет и контроль за ходом работ по обращению заявителя
- привязка обращений к конкретному объекту
- «транспортная система» для доставки обращений до конечных исполнителей

Интеграции

- интеграция с финансовыми и учетными системами (1С, Парус, самописные)
- интеграция с внешними системами для обмена данными в автоматическом режиме



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

+7 960 770 70 90



ЭТАЛОН

готовое решение + конфигурирование

(входит в реестр отечественного ПО)

ЭТАЛОН

назначение системы:

- ✓ создать единую и достоверную информационную основу деятельности
- ✓ повысить операционную эффективность и слаженность в работе структур и территорий
- ✓ выявлять риски и помогать работать «на опережение»

ЭТАЛОН

ЭТО комплексное решение
для заказчиков,
которые хотят
автоматизировать:

- ✓ оперативное управление и рутину
- ✓ процесс сбора первичных и агрегированных данных из разных источников
- ✓ процесс автоматического формирования управленческой отчетности
- ✓ процесс быстрого анализа ситуации на основе первичных данных
- ✓ процесс постоянного машинного анализа данных и выявления рисков
- ✓ процесс подготовки и администрирования инвест. программ

ЭТАЛОН

ЭТО комплексное решение
для заказчиков,
которые хотят
автоматизировать:

- ✓ процесс администрирование проектов
- ✓ процесс постановки и контроля исполнения поручений
- ✓ администрирование бизнес-процессов
- ✓ сквозной контроль за ходом исполнения контрактов
в том числе детальный контроль строительства,
реконструкции, кап.ремонта, ремонта, тек. содержания
- ✓ контроль за выполнением план-графиков
- ✓ стройконтроль / технадзор / взаимодействие
с подрядчиком
- ✓ мониторинг проблем на объектах и статус
мероприятий по их устранению

ЭТАЛОН

для руководителей:

- ✓ непрерывный анализ данных, характеризующих работу всей структуры, удаленных подразделений, подрядчиков и людей «на местах»
- ✓ управленческий радар с «предупредительными сигналами» о необходимости своевременно отреагировать на «отклонения»
- ✓ возможность быстро разобраться в ситуации и задавать «неудобные вопросы» опираясь на факты
- ✓ инструмент для сокращения трудоемкости администрирования и контроля регламентных процессов
- ✓ меньше «проблем» и «непредвиденных ситуаций»
- ✓ прогноз результатов с высокой степенью достоверности

**ЭТАЛОН
для исполнителей:**

- ✓ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ РАБОТУ
- ✓ сотрудникам в аппарате не тратить время на подготовку запросов, согласование информации и свод данных с территорий
- ✓ исполнителям на местах – не тратить силы на подготовку отчетов «по запросу»
- ✓ меньше количество ошибок ввода и переноса данных
- ✓ меньше времени на поиск, обработку и анализ данных
- ✓ выше скорость и меньше трудозатрат на координацию и информационное взаимодействие
- ✓ меньше времени на доклады

ЭТАЛОН
для подрядчика:

- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ СЕБЯ ГЛАЗАМИ ЗАКАЗЧИКА
- ✓ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
- ✓ БЫСТРЕЕ ИСПРАВЛЯТЬ ЗАМЕЧАНИЯ
- ✓ БЫСТРЕЕ ПОЛУЧАТЬ ОПЛАТЫ
- ✓ НАХОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДРЯДЫ
- ✓ ...

✓ СОКРАЩАЕМ ВРЕМЯ НА РУТИНУ И РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
(+ работаем более скоординированно + успеваем больше и быстрее)

✓ все участники имеют единую и достоверную
информационную основу деятельности (все стало прозрачнее и яснее)

В РЕЗУЛЬТАТЕ:

✓ управление становится не «по факту», а «предупредительным»,
т.е. видим отклонения на ранней стадии и устраняем их

✓ сокращается количество «информационных»
совещаний и запросов, т.к. большинство ответов на вопросы
можно получить on-line из первоисточников, не отвлекая коллег

✓ можем работать в любое время, в любом месте где есть сеть
+ уезжать, не боясь за то, что работа будет «завалена»

В РЕЗУЛЬТАТЕ:

✓ формируется среда для роста продуктивности дельных людей,
снижаются возможности для «тумана» и «незаменимости»

✓ ДОСТИГАЕМ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ с ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ

ЭТАЛОН:

- ✓ достоверная информационная основа деятельности
- ✓ управление проектом
- ✓ администрирование и контроль процессов
- ✓ профилактика нарушений
- ✓ оценка деятельности
- ✓ формирование среды для повышения качества работы команд и увеличения дельных людей
- ✓ развитие кадрового потенциала
- ✓ достижения значимых результатов с простыми людьми
- ✓ API и другие функциональные возможности



ЭТАЛОН

Ситуационный центр

(сбор и визуализация достоверной управленческой отчетности)

- автоматический сбор первичных и агрегированных данных из других систем
- визуализация и контроль показателей по всем направлениям деятельности
- формирование единого достоверного информационного пространства
- конфигурирование общих и индивидуальных рабочих столов
- анализ показателей с помощью различных инструментов
- экспорт данных

Контроль

объектов, контрактов и подрядчиков

- ведение единого паспорта объекта
- сводный план работ
- контроль финансирования
- управление контрактами
- контроль исполнения
- интеграция с 1С Бухгалтерия и др.
- управление рисками
- строительный контроль
- общественный контроль
- формирование и согласование КС
- электронное взаимодействие с подрядчиком

Оперативное управление

проектное, процессное + ручное управление

- проектное управление
- процессное управление
- связь с целевыми показателями
- связь с объектами и контрактами
- учет поручений
- администрирование и контроль исполнения поручения
- анализ исполнительской дисциплины
- планшетная версия
- мобильное приложение

Администрирование процессов

- автоматизация регламентных процессов
- автоматизация процессов с использованием данных из разных систем
- автоматическое формирование показателей
- автоматизация процессов по выявлению рисков в режиме 24/7

Конструктор отчетов

- формирование OLAP кубов для конструирования отчетности «на местах» с использованием данных Системы
- автоматическое формирование OLAP кубов на верхнем уровне по всем территориям на основании первичных и агрегированных данных из Системы
- конструктор отчетов

Инвест.программы

(формирование и контроль)

- формирование проектов программ
- контроль за ходом исполнения программ
- связь: Программа - объект - контракт - работа - платеж

Мобильное приложение

- мобильное приложение для работы на iOS и Android
- весь базовый функционал для работы в любое время в любом месте*

Работа с обращениями

- учет и контроль за ходом работ по обращению заявителя
- привязка обращений к конкретному объекту
- «транспортная система» для доставки обращений до конечных исполнителей


Интеграции

- интеграция с финансовыми и учетными системами (1С, Парус, самописные)
- интеграция с внешними системами для обмена данными в автоматическом режиме

достоверная и доступная информационная основа деятельности

поручения и задачи
(по направлениям и проектам)

визуализация статусов

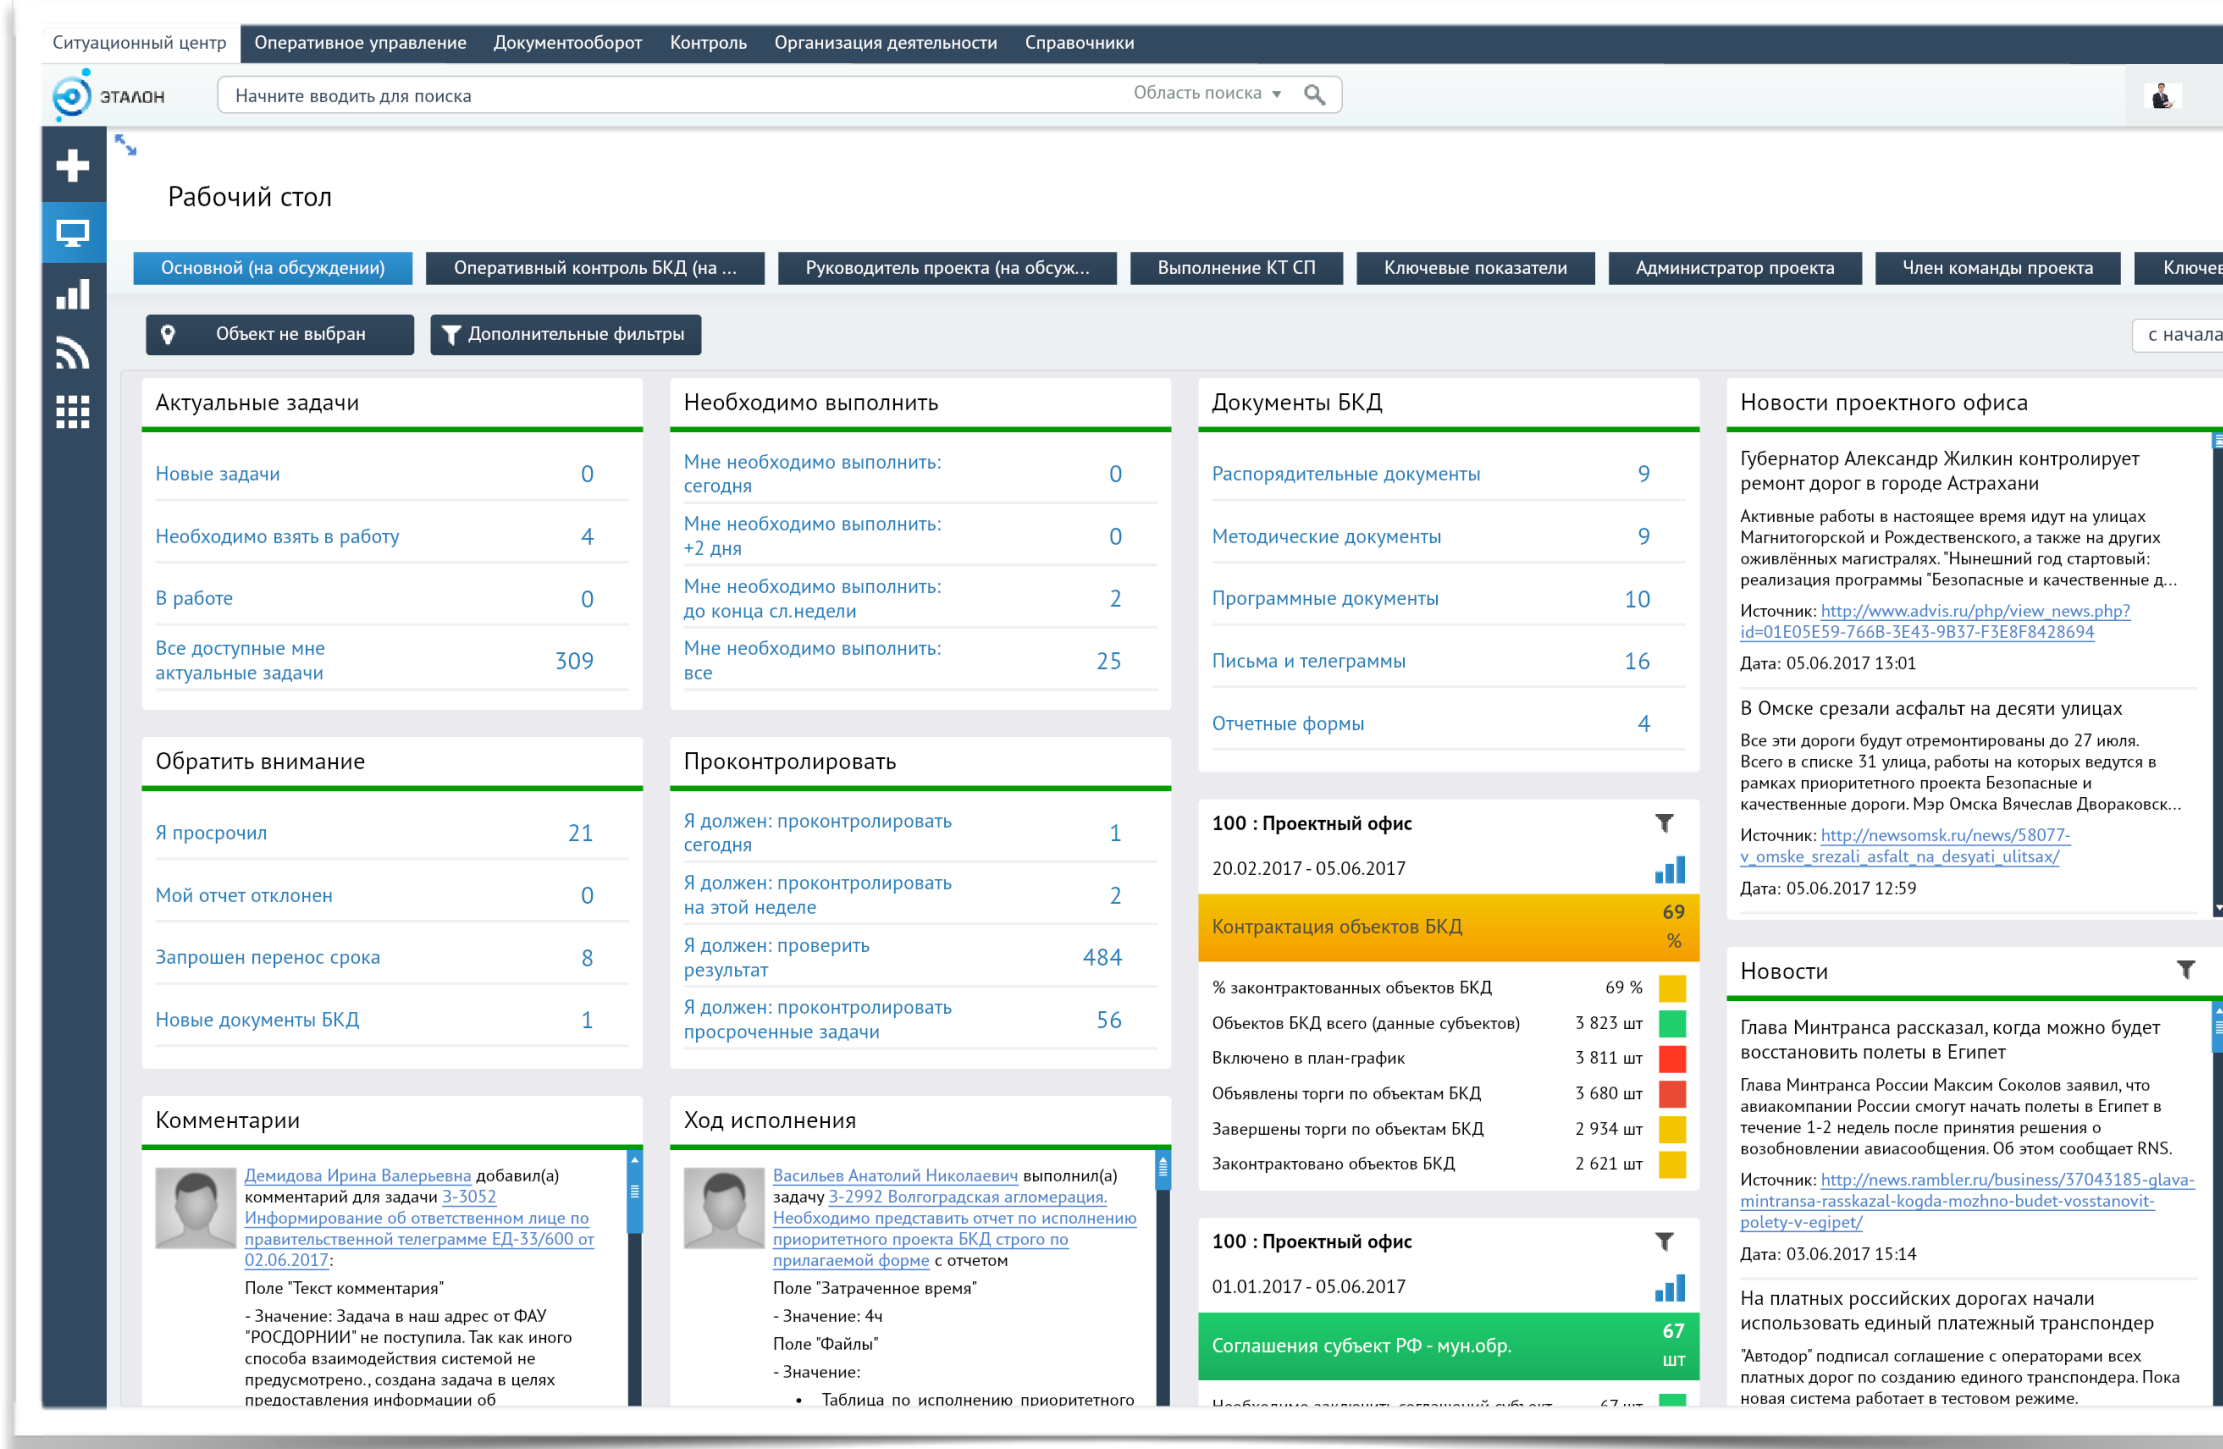





документы по проекту

автоматический мониторинг СМИ

ленты событий

показатели по проекту, процессу и др. параметрам

СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ / «ПРОВАЛИВАНИЕ»

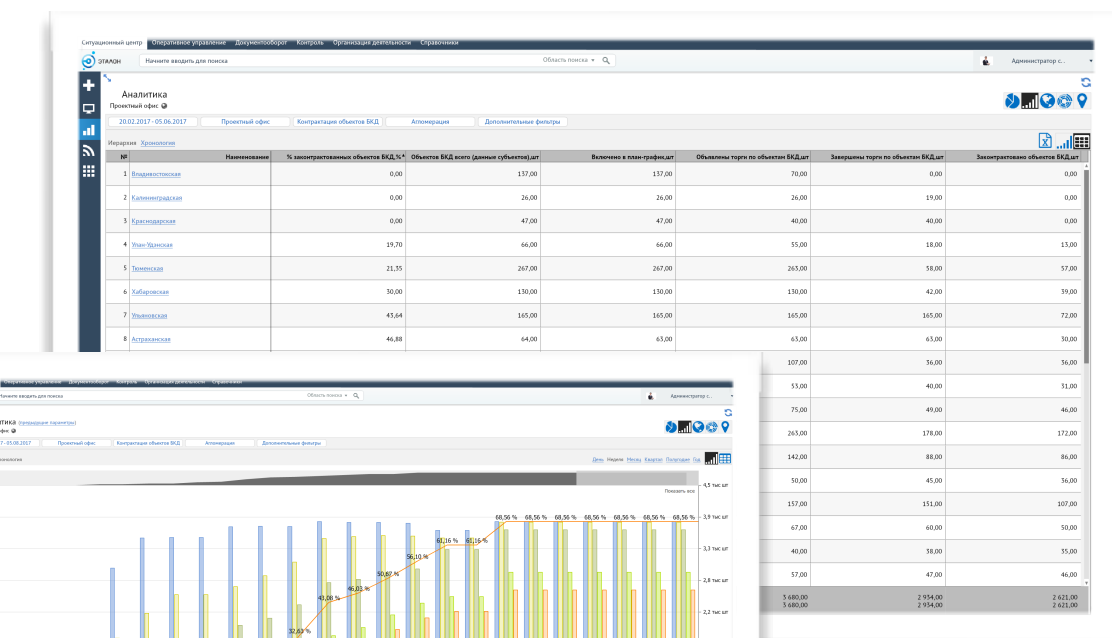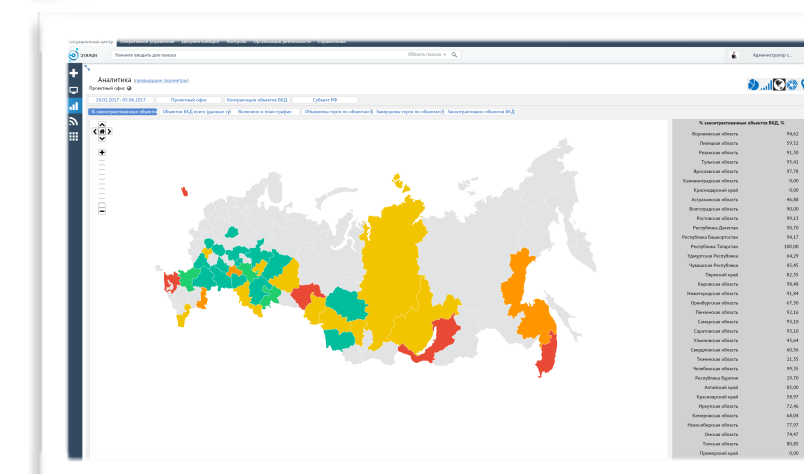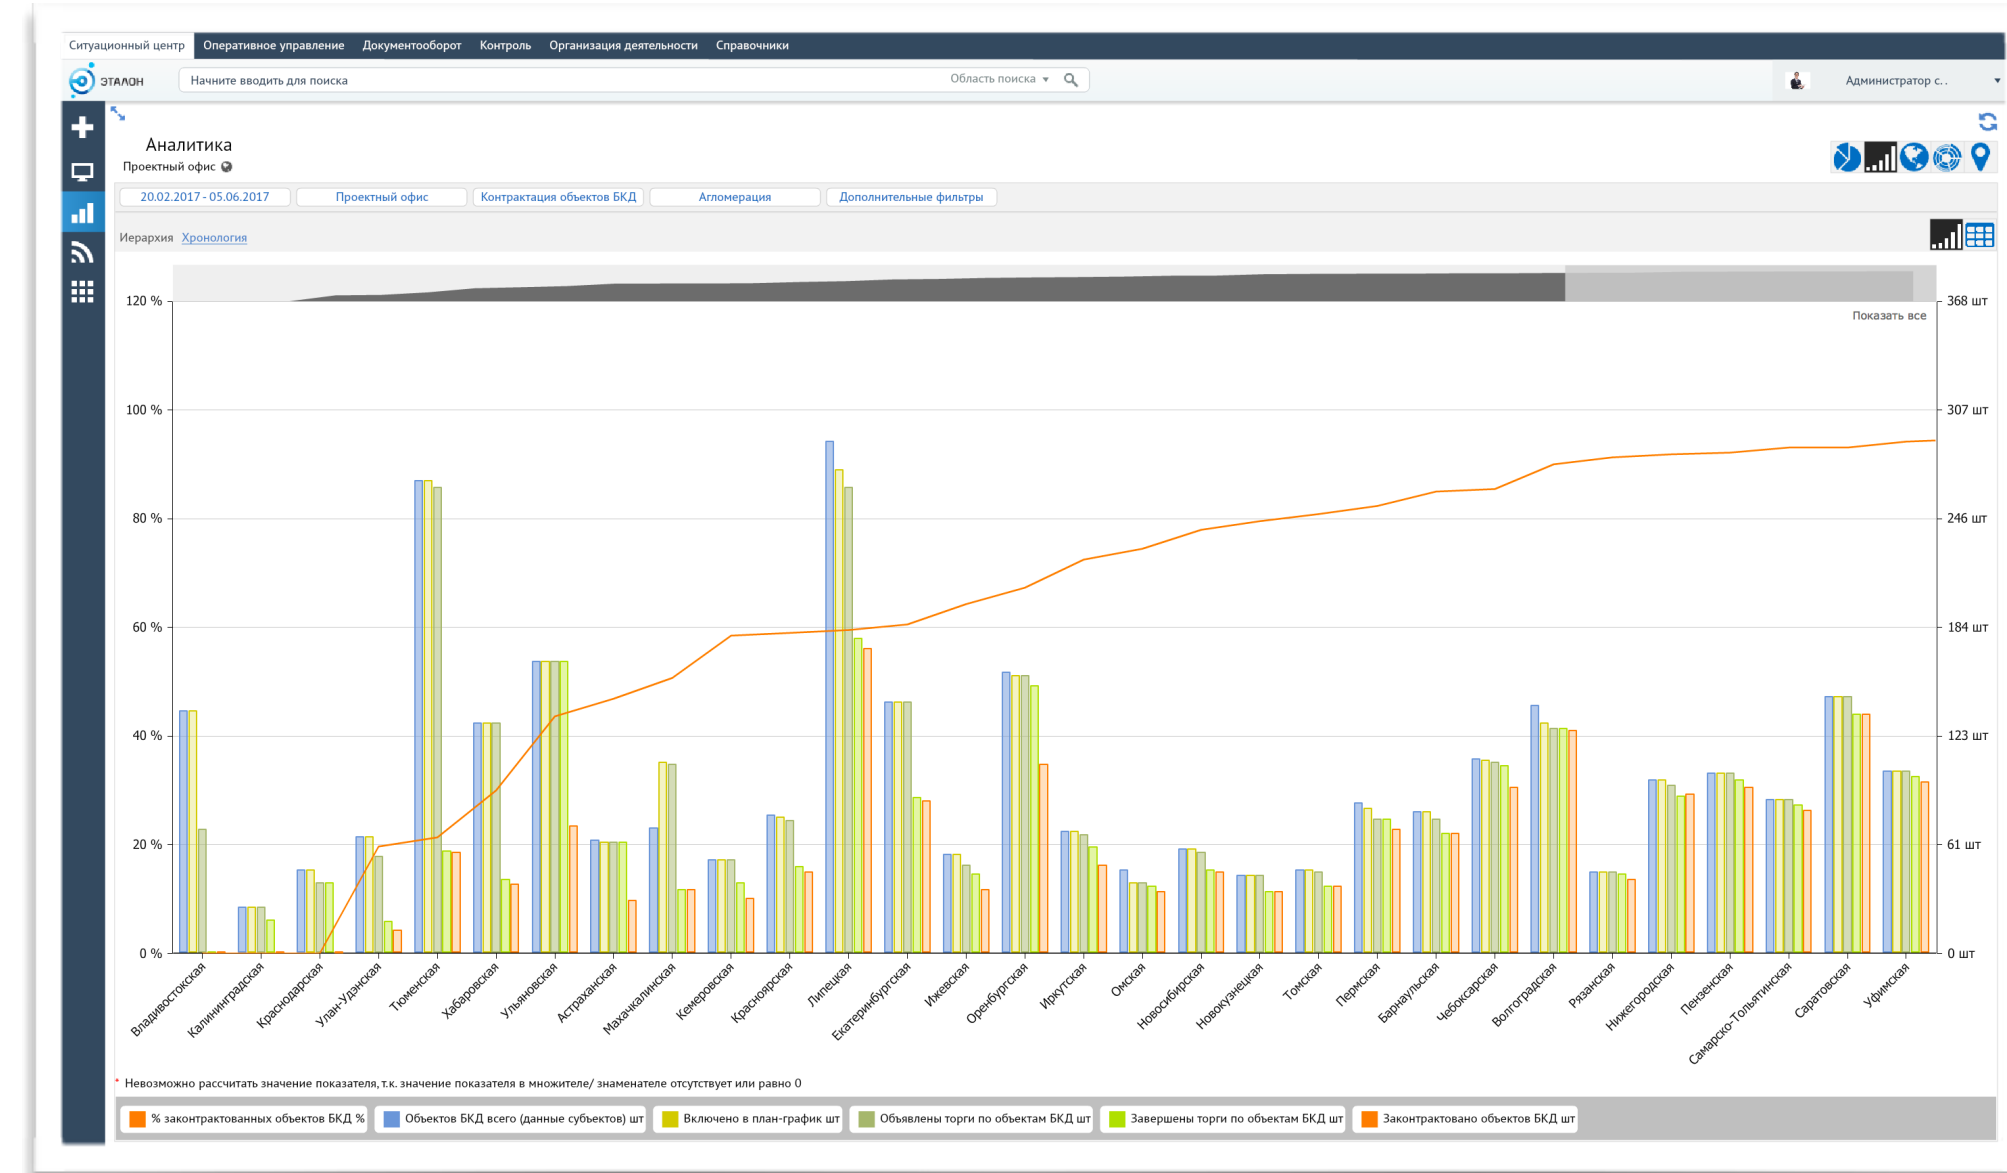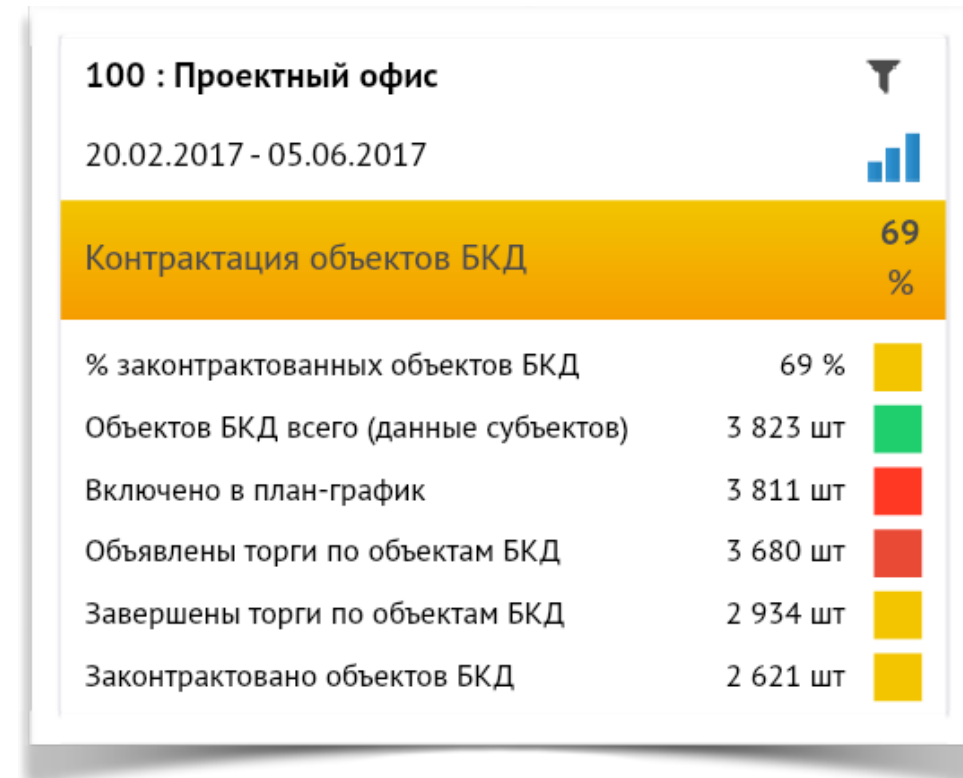

✓ контроль и аналитика на основе первичных данных

✓ возможность из агрегированных показателей «провалиться» до конкретного объекта / договора / платежа, муниципалитета / учреждения / подразделения / сотрудника

контроль объектов и контрактов

Контракт № 43/17 от 02.05.2017 На исполнении

- Основное
- Обеспечение контракта
- Планы и выполнение
- Платежи
- Прикрепленные файлы
- Связанные задачи
- Субподрядчики
- Настройки

Источник контракта: Красноярский край

Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 792+000 - км 802+000 в Красноярском крае (прямое направление, I этап). Ремонт автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 792+000 - км 802+000 в Красноярском крае (обратное направление, II этап)

НМЦ контракта: 249 638 910 руб.

Реестровый номер с сайта госзакупок: -

Номер контракта: 43/17

Дата подписания контракта: 02.05.2017

Контракт: Файлы не прикреплены

Период исполнения контракта: 02.05.2017 - 31.10.2018

Стоимость контракта: 249 638 910 руб.

Процент аванса:

Максимальная сумма аванса:

Ответственное лицо заказчика:

Контракт № 43/17 от 02.05.2017

- Основное
- Обеспечение контракта
- Планы и выполнение

Статус конкурса: -

Приказ о проведении закупки: [Прикрепленные файлы: 1](#)

Извещение: <http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/com>

Контракт № 43/17 от 02.05.2017 На исполнении

- Основное
- Обеспечение контракта
- Планы и выполнение
- Платежи
- Прикрепленные файлы
- Связанные задачи
- Субподрядчики
- Настройки

КБК контракта: -

Стоимость: 249 638 910 руб.

Планируемое выполнение: 249 638 910 руб.



Фактическое выполнение: 3 699 775 руб.

Резерв на непредвиденные затраты: 0 руб.

Выполнено непредвиденных работ: -

За все года

Период	План		Акт		Сумма
	Сумма		Дата	№	
2017 Май		3 699 775	25.05.2017	1	3 699 775
2017 Июнь		12 000 000			
2018 Май		1 566 235			
2018 Июнь		38 565 596			
2018 Июль		50 000 000			
2018 Август		57 000 000			
2018 Сентябрь		50 160 721			
Итого:		249 638 910			3 699 775

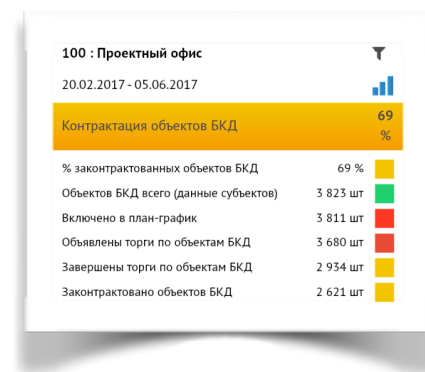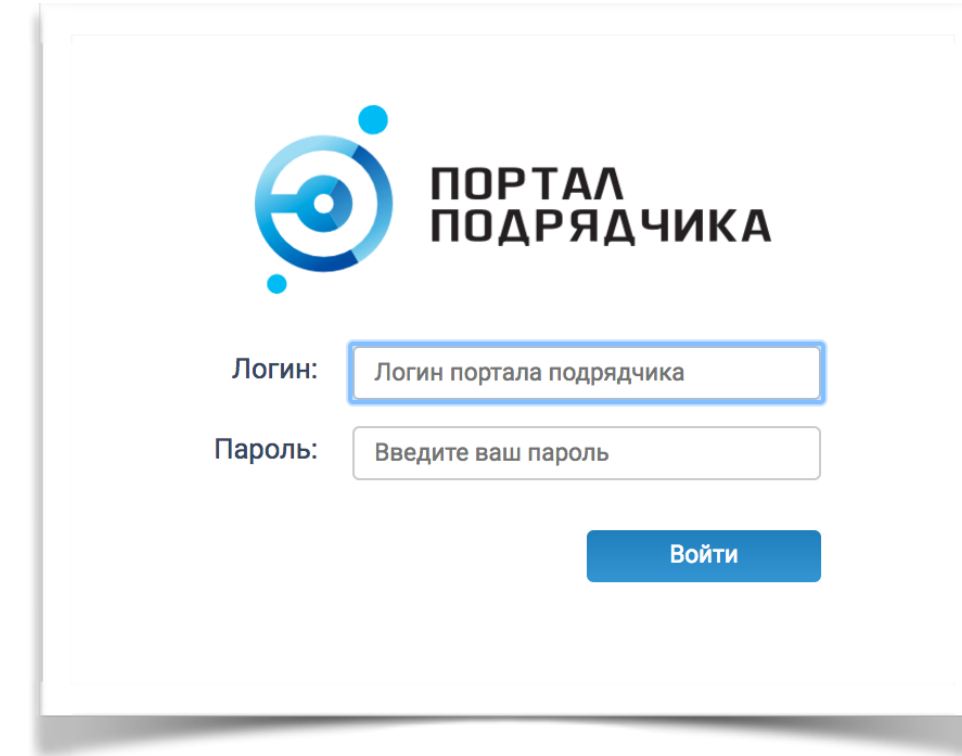



ПОРТАЛ ПОДРЯДЧИКА

Логин:

Пароль:


Войти

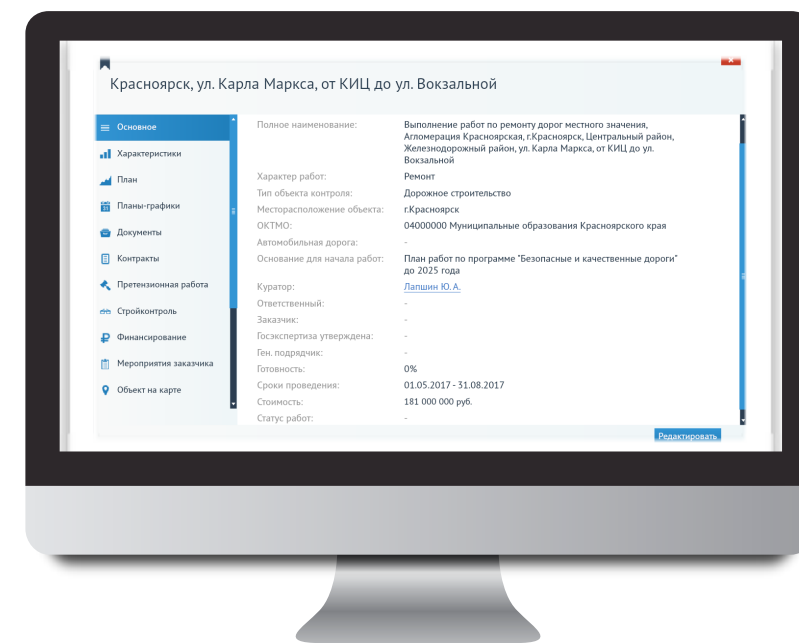



ЭТАЛОН

✓ **Взаимодействие
с подрядчиком**




**ПОРТАЛ
ПОДРЯДЧИКА**

Логин:

Пароль:

[Войти](#)

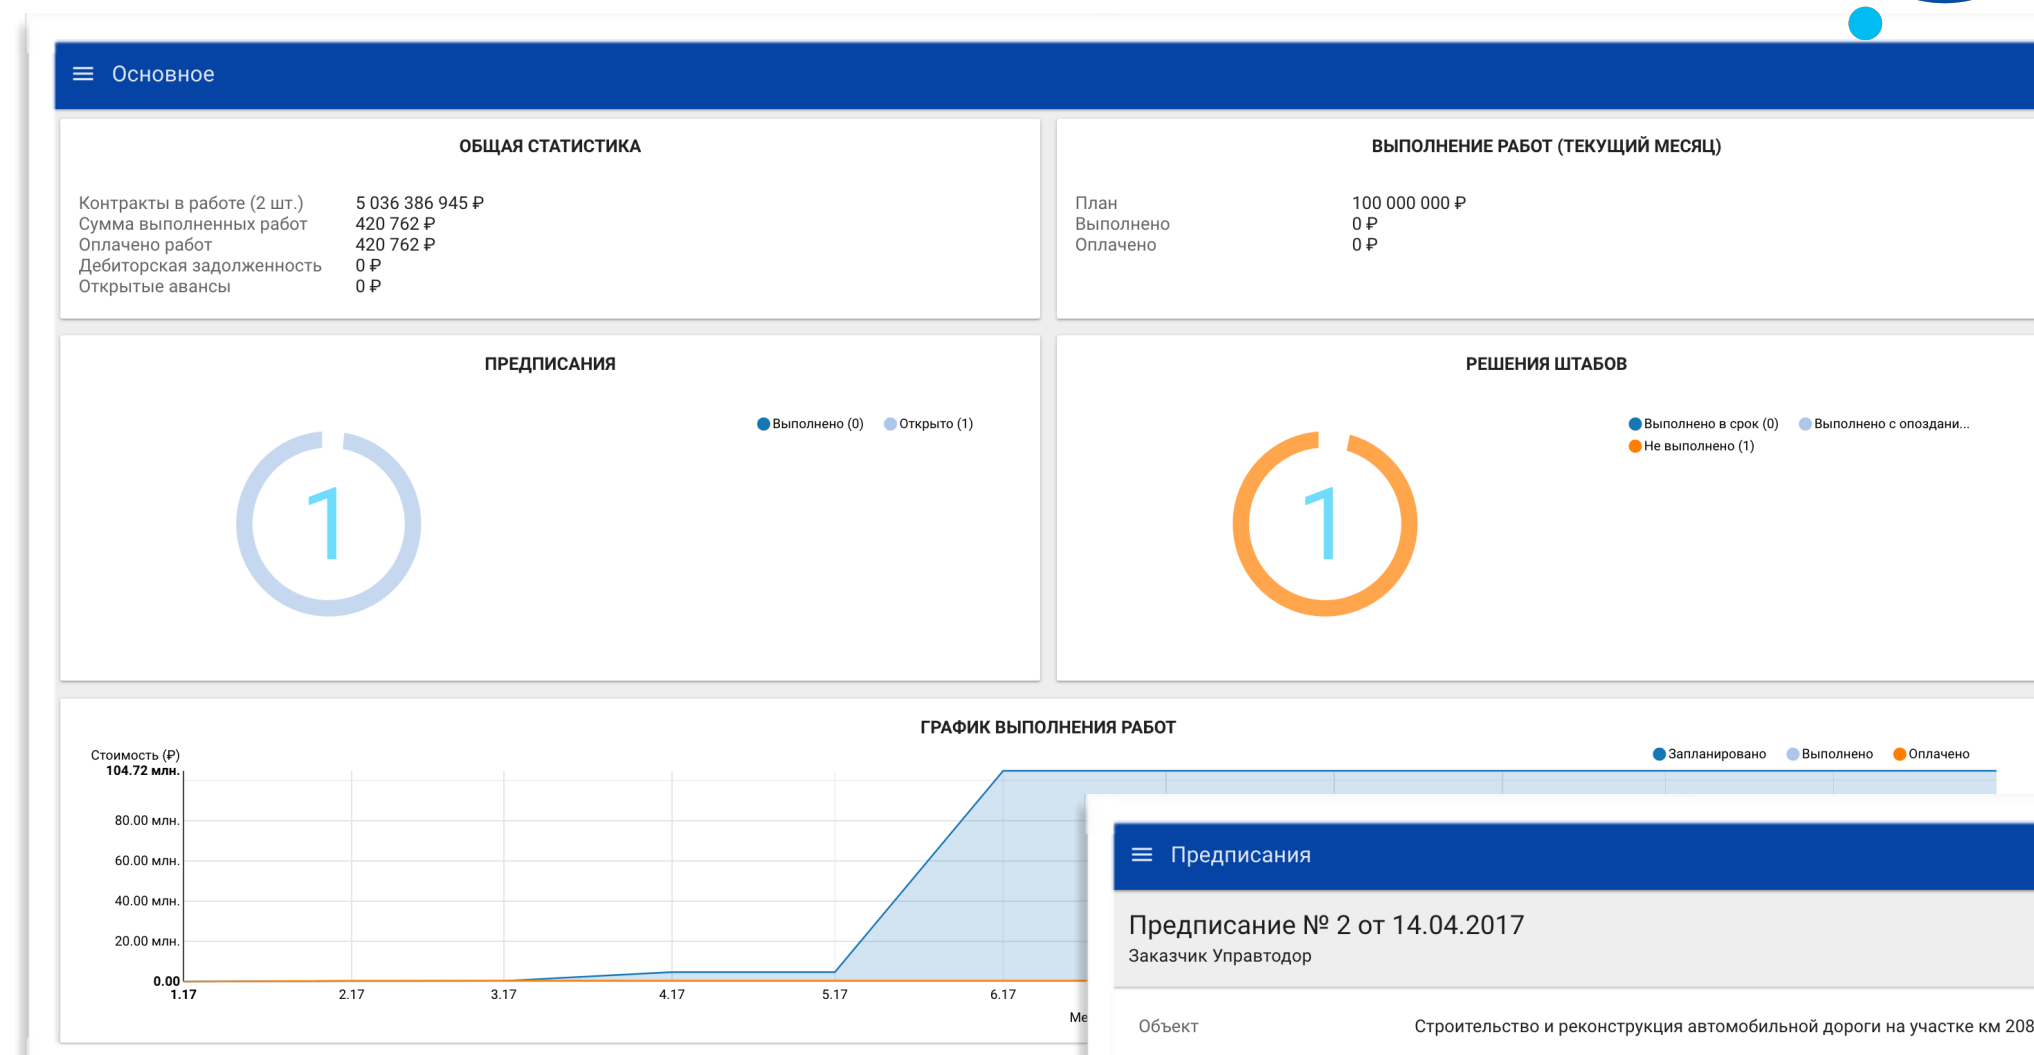

Предписания

Предписание № 2 от 14.04.2017
Заказчик: Управтодор

Объект	Строительство и реконструкция автомобильной дороги на участке км 208+500 - км 215+000
Дата повторной проверки	21.04.2017
Работа	Заземление опор
Расположение	
Форма выдачи	Предписание
Краткое содержание	неправильная схема соединения проводов заземления

Контракты

Контракт № ГК-01/2017 от 02.12.2016
Заказчик: Управтодор

ОСНОВНОЕ **ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ** ВЕДОМОСТЬ РАБОТ АКТЫ ПЛАТЕЖИ

Срок выполнения до 30.04.2017	Не исполнен	Срок выполнения до 28.02.2017	Исполнен	Срок выполнения до 31.03.2017	Исполнен
Закрты по актам:	4 332 200,05 руб. 37 478,40 руб.	Закрты по актам:	350 910,56 руб. 350 910,56 руб.	Закрты по актам:	32 373,15 руб. 32 373,15 руб.
Акт №01 от 31.01.2017	37 478,40 руб. Не подписан	Акт №02 от 28.02.2017	350 910,56 руб. Не подписан	Акт №03 от 31.03.2017	32 373,15 руб. Не подписан

Контракты

Акт №0123 от 24.04.2017 На согласовании
Контракт №ГК-01/2017 от 02.12.2016

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ ИСТОРИЯ

Отчётный период: 01.01.2015-31.01.2015

№ по смете	Наименование работы	Ед. изм.	План. объём	План. стоимость	Факт. объём	Ед. расценка	Факт. стоим.	Исполнено	Действия
1	Валка леса: лес редкий д до 16 см (сосна, береза)	шт	0,0000	0,00 Р	4,6000	9,76 Р	44	100,00%	Редактировать Отправить на согласование Удалить акт
15.2	Засыпка ям	шт	0,0000	0,00 Р	50,0000	20,51 Р	1 025	100,00%	Печать КС-2
2	Трелевка деревьев	шт	0,0000	0,00 Р	3 840,0000	76,38 Р	293 299	100,00%	Печать КС-3
3	Разделка древесины сосны, березы	шт	0,0000	0,00 Р	768,0000	22,56 Р	17 326,08 Р	100,00%	

Итоговая стоимость по акту: 311 695,68 Р

Страница: 1 Записей на странице: 15 1 - 4 из 4

☰ Посещения объектов
🔍 ☰

Посещение 10.08.2018 18:34

Вид проверки	Внешняя проверка	Замечания	1 ■
Проверка	Плановая	Не устранено	
Заказчик		всего	0 ■
Объект		из них критичных	0 ■

ГКУ "Ярдорслужба" (7627013227)

ремонт автомобильной дороги "Ярославль - Тутаев" - совхоз "Ярославка", км 0+021 км - 2+459 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

[4521 от 28.04.2018](#)


ие работ по ремонту автомобильной дороги "Ярославль - Тутаев" - совхоз "Ярославка", км 0+021 - км 2+459, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

В.

[ПОДРОБНЕЕ](#) [СВЕРНУТЬ](#)

Проверка	Плановая	Замечания	3 ■
Заказчик	ГКУ ЯО "Ярдорслужба" (7627013227)	Не устранено	
Объект	(а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области	всего	0 ■
Контракт	№ ГК №934521 от 28.04.2018	из них критичных	0 ■
Предмет контракта	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 - км 21+698, км 22+850 - км 27+904, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области		
Объект посетил	Чупров К. В.		

[ПОДРОБНЕЕ](#) [СВЕРНУТЬ](#)



ПОРТАЛ ПОДРЯДЧИКА

Логин:

Пароль:

[Войти](#)

☰ Посещения объектов

Посещение 10.08.2018 15:47

Заказчик: ГКУ ЯО "Ярдорслужба" (7627013227)

ОСНОВНОЕ **ЗАМЕЧАНИЯ**

Замечание ЗК-000056 от 10.08.2018 15:47

Устранено

наблюдается занижение обочин местами до 10 см, которое не обозначено ТСОДД.

(а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

14.08.2018 04:00

Замечание ЗК-000056 от 10.08.2018 15:47

Устранено

наблюдается наличие части от пыли и грязи после выполнения дорожных работ по фрезерованию.

(а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

14.08.2018 04:00

Замечание ЗК-000057 от 10.08.2018 15:47

Устранено

3.Обочины досыпаются растительным грунтом до кромки асфальта.

Объект (а/д рег) Ремонт автомобильной дороги Ярославль - Шопша, км 14+244 - км 19+335, км 20+936 км - 21+698, км 22+850 - км 27+904 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области

Срок устранения 14.08.2018 04:00




ПОРТАЛ
ПОДРЯДЧИКА

Логин:

Пароль:

Войти

контроль процессов

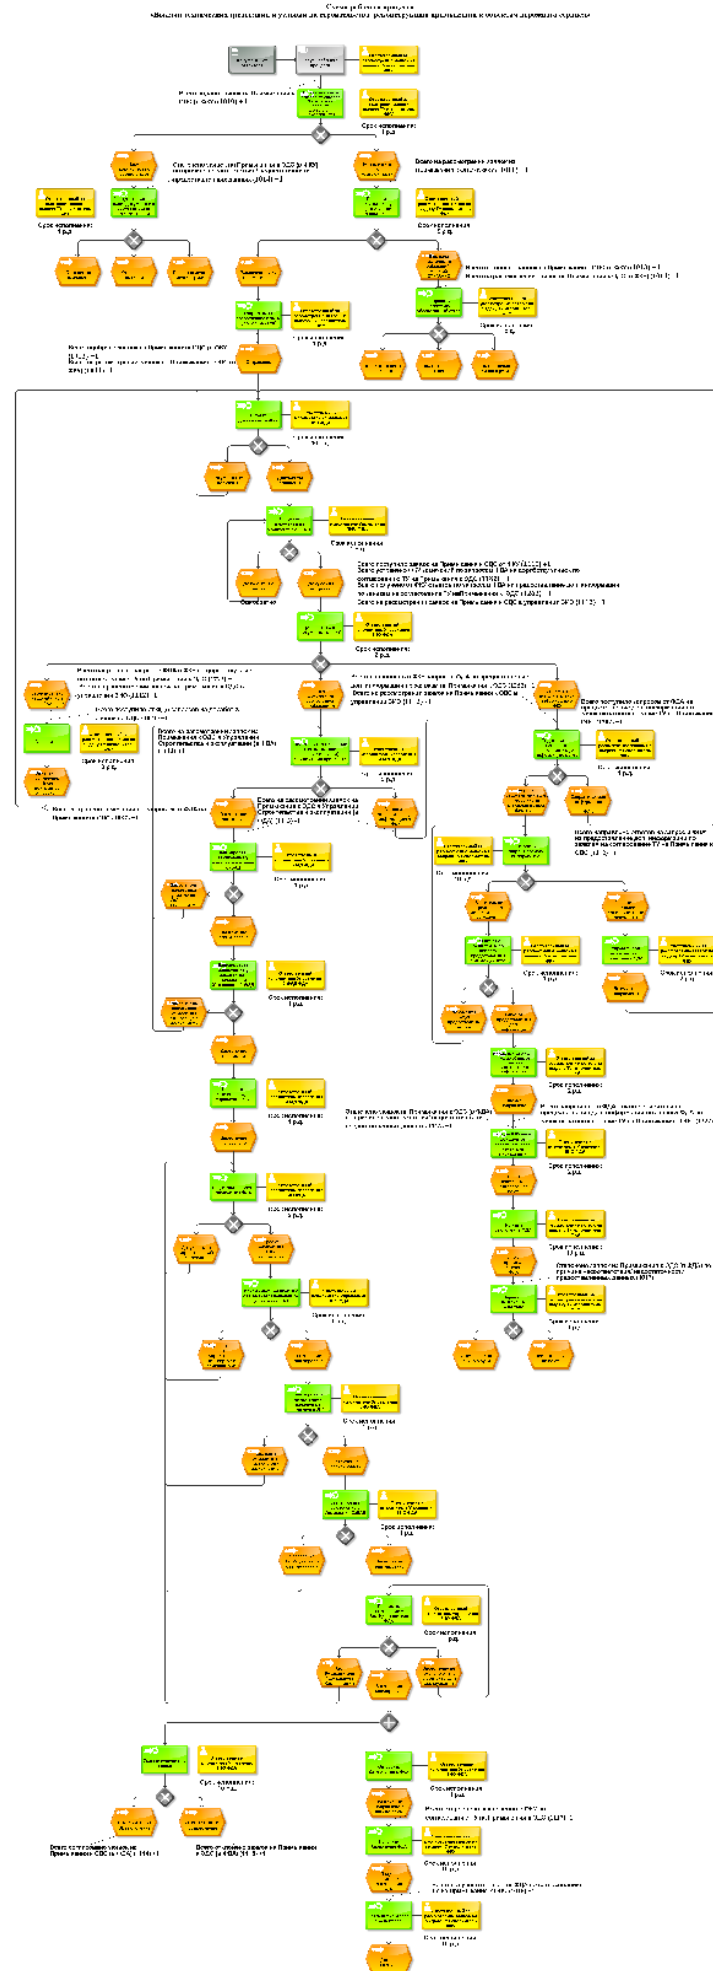

Автоматическое администрирование процессов

Автоматическое формирование показателей

Гибкость управления и скорость изменений процессов
(нет необходимости переучивать всех сотрудников)

Автоматический мониторинг показателей
и поиск отклонений для запуска процессов
(реагирования на отклонения)

Масштабируемость и повышения эффективности
за счет перевода опыта работы лучших сотрудников
в процессы и их применения на всех объектах



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

использование платформы
для администрирования
процессов и оперативного
управления приоритетным
проектом «БКД»
и нац. проектом «БКАД»



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН


- ✓ 83 субъекта
- ✓ 2 951 пользователь
- ✓ 43 935 задач на контроле
- ✓ 15 041 объект контроля
- ✓ 563 млрд.руб на контроле
- ✓ 26 074 отчетов кураторов
- ✓ 4 269 обращений граждан
- ✓ 1 650 подрядных организаций



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

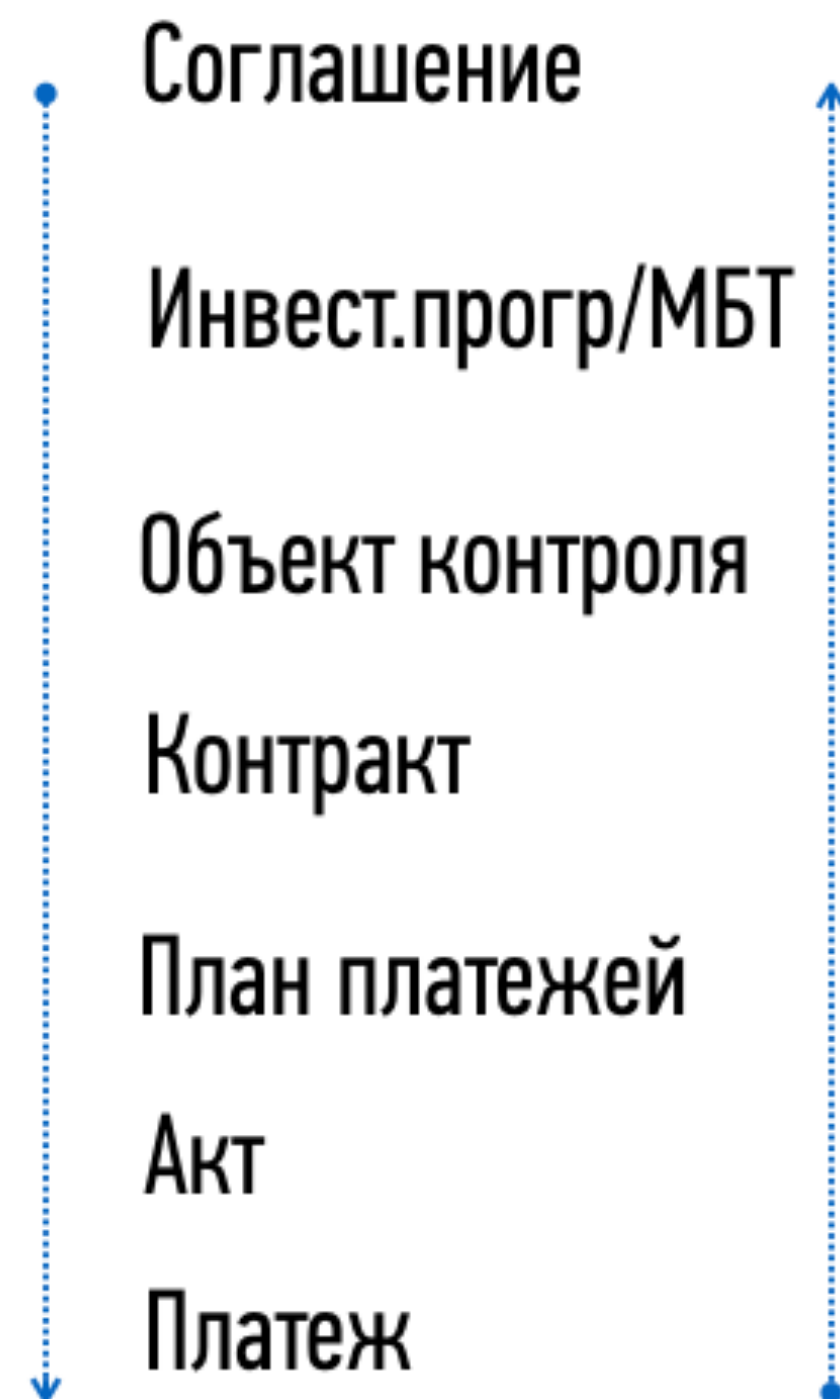

Сквозной ФИНАНСОВЫЙ контроль

+ идет сверка с данными ФК

+ идет работа по информационному обмену
между системами ФК и Эталоном



Сквозной контроль ФИНАНСОВЫЙ

Паспорт объекта межбюджетных трансфертов - Астраханская область. Реализация мероприятий приоритетного проекта Безопасные и качественные дороги ГП РТС

Основное

Дополнительно

Целевые показатели

Соглашения

Документы

Фотографии

Объекты контроля

История изменений

Введите текст и нажмите Ввод для поиска...

Наименование объекта	Сроки выполнения	Стоимость, тыс.руб.	Готовность	Выполнение в физ. объемах
Капитальный ремонт моста через р.Белый Ильмень на автомобильной дороге Астрахань-Красный Яр-граница Казахстан...	19.02.2018 - 28.06.2019	299 590,6	7,66%	7,07%
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100	08.05.2018 - 31.10.2018	64 151,006	93,76%	93,76%
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Астрахань-Евпраксино	28.03.2018 - 31.10.2018	7 400,44	100%	100%
Устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань-...	28.03.2018 - 31.10.2018	37 444,415	67,1%	52,15%
Устройство освещения пешеходных переходов на солнечных батареях на автомобильной дороге общего пользования региона...	31.03.2018 - 31.10.2018	2 382,51	0%	0%
Капитальный ремонт моста через р.Табола на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Астрахань-...	14.05.2018 - 31.10.2018	39 989,092	33,61%	33,01%
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Астрахань-Камызяк км 22+800 - км 23+569	31.03.2018 - 31.10.2018	11 967,666	98,77%	98,77%

Страницы: << < 1 2 3 4 5 > >> Перейти на страницу 1



Сквозной контроль **ФИНАНСОВЫЙ**

Паспорт
меропр

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100

Основное

Сведения о реализации

Характеристики

План

Планы-графики

Документы

Контракты

Претензионная работа

Дневник куратора

Стройконтроль

Отчеты подрядчика

Код объекта:	021
Полное наименование:	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100
Характер работ:	Ремонт
Тип объекта контроля:	Дорожное строительство
Месторасположение объекта:	км 0+000 - км 7+100 а/д Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер
ОКТМО:	12000000 Муниципальные образования Астраханской области
Автомобильная дорога:	Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000-км 13+006
Значение объекта:	Регионального значения
Основание для начала работ:	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Астраханской агломерации"

7,07%

93,76%

100%

52,15%

0%

33,01%

98,77%

Редактировать



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

Сквозной контроль ФИНАНСОВЫЙ

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100

- Основное
- Сведения о реализации
- Характеристики
- План
- Планы-графики
- Документы
- Контракты
- Претензионная работа
- Дневник куратора
- Стройконтроль
- Отчеты подрядчика

Ответственный: [Иванов Д. В.](#)
 Заказчик: [АО ГКУ "Астраханьавтодор"](#)
 Госэкспертиза утверждена: -
 Ген. подрядчик: [ООО "ВРСК"](#)
 Готовность: 93,76%
 Сроки выполнения: 08.05.2018 - 31.10.2018
 Стоимость: 64 151 006,1 руб.
 Статус работ: СМР
 Объект сдан: Нет
 Дата окончания гарантийного срока: 31.10.2022
 Справочный: Нет

▼ Статусы торгов по ОК

Включен в план-график торгов:	27.02.2018
Уникальный номер позиции плана-графика:	2018082520000180020000240006
Торги объявлены:	27.02.2018
Номер извещения об осуществлении закупки:	0825200001818000011
Торги завершены:	23.04.2018
Законтрактрован полностью:	08.05.2018

ПЛАН-ГРАФИК № 2018082520000180020001

Размещено 08.05.2018 17:07 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)
по местному времени заказчика

Показать изменения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА	ПОЗИЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА	ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ	ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ДОКУМЕНТЫ	ЖУРНАЛ ВЕРСИЙ	ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
ОБЪЯСНЕНИЕ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПОЗИЦИИ	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ	ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАКУПКИ		

СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Уникальный номер позиции плана-графика: 2018082520000180020000240006

Идентификационный код закупки (ИКС)	Год	Идентификационный код заказчика	Номер закупки в плане закупок	Номер закупки в плане-графике закупок	Код позиции КТРУ	Код вида расходов
18	23015095508301501001	0010	006	4211	244	

Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 – км 7+100 в Наримановском районе Астраханской области

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

Способ определения поставщика: Электронный аукцион

СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ И СРОКЕ ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Планируемый срок начала осуществления закупки: Февраль 2018

ЗАКУПКА №0825200001818000011 **ISS**

Размещено: 31.03.2018 12:34 (MSK+1 (UTC+4) Самара)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ДОКУМЕНТЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА | ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 31.03.2018 №ИИ/2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполителя): Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.sberbank-ast.ru>

Размещение осуществляет: Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ "АСТРАХАНЬАВТОДОР"

Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 – км 7+100 в Наримановском районе Астраханской области

Этап закупки: Определение поставщика завершено

Сведения о связи с позицией плана-графика: 2018082520000180020000240006

Номер типового контракта, типовых условий контракта: Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена



Сквозной контроль **ФИНАНСОВЫЙ**

Контракт № 0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018 На исполнении

- Основное
- Обеспечение контракта
- Планы и выполнение
- Платежи
- Доп. соглашения
- Документы
- Связанные задачи
- Субподрядчики
- Настройки

Предмет контракта:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер
НМЦ контракта:	84 968 220 руб.
Стоимость контракта по результатам торгов:	64 151 006,1 руб.
Текущая стоимость контракта:	64 151 006,1 руб.
Реестровый номер с сайта госзакупок:	0825200001818000011
Номер контракта:	0825200001818000011-0402241-03
Дата подписания контракта:	08.05.2018
Контракт:	Прикрепленные файлы: 1
Период исполнения контракта:	08.05.2018 - 31.10.2018
НДС:	18 %
Коэффициент снижения:	0,755
Процент аванса:	15 %
Максимальная сумма аванса:	9 622 650,92 руб.
Ответственное лицо заказчика:	-
Исполнитель:	ООО "ВРСК"

Исполнить Расторгнуть Редактировать



**БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ**



ЭТАЛОН



Сквозной контроль ФИНАНСОВЫЙ

Контракт № 0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018

КБК контракта: - Резерв на непредвиденные затраты: 0 руб.
 Стоимость: 64 151 006,1 руб. Выполнено непредвиденных работ: -
 Планируемое выполнение: 64 151 006,1 руб.
 Фактическое выполнение: 60 146 652,02 руб.

План	Акт	Платеж			
Период	Сумма	Дата	№	Сумма	Вид платежа
2018 Июнь	14 837 010,84	06.06.2018	1	14 837 010,84	
2018 Июнь	33 645 774,24	25.06.2018	2	33 645 774,24	
2018 Июль	11 663 866,94	20.07.2018	3	11 663 866,94	
2018 Октябрь	4 004 354,08				

Аванс	08.06.2018	679312	9 510 066
Выполнение	14.06.2018	700402	5 192 953,79
Выполнение	21.06.2018	735064	7 418 505,42
Выполнение	27.06.2018	769214	11 776 020,98
Выполнение	04.07.2018	811216	16 822 887,12
Выполнение	24.07.2018	11137	4 082 353,43
Выполнение	24.07.2018	8908	5 831 933,47
Итого:			60 634 720,21

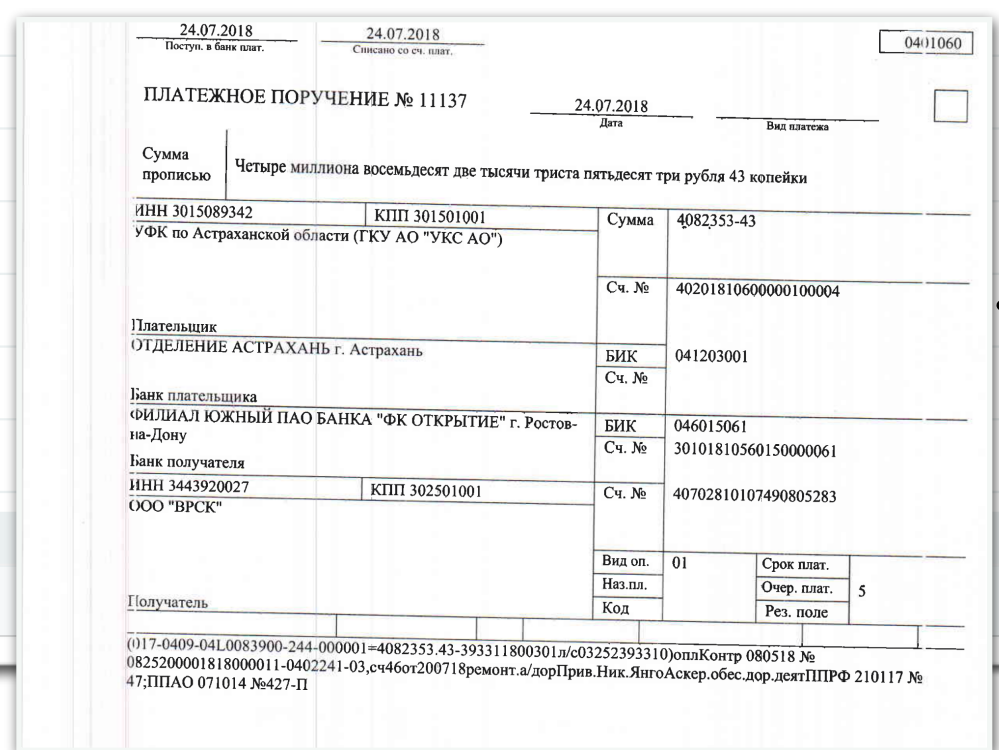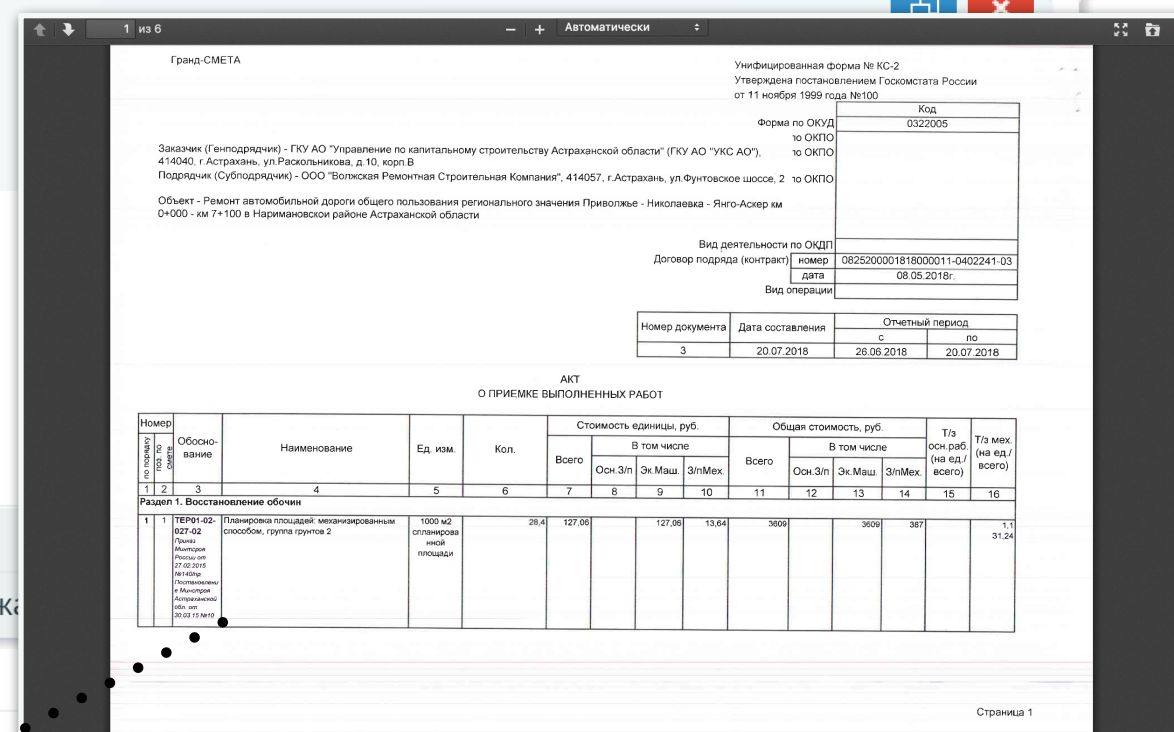

Исполнить | Расторгнуть | Редактировать

Сквозной контроль ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100

И претензионная работа

- Дневник куратора
- Стройконтроль
- Отчеты подрядчика
- Финансирование
- Мероприятия заказчика
- Объект на карте
- Контакты
- Поручения руководителя
- Решения штабов
- Вопросы и проблемы
- Веб-камера

Справка о посещениях | Журнал посещений | Журнал замечаний

Куратор: [Диденко Геннадий Васильевич](#)

Контракт №0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018 "Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер"

Подрядчик: [ООО "ВРСК"](#)

Дата и время последнего посещения: [20.07.2018 11:00](#)

Количество совершенных выездов: 2

Объект не посещался: 20 дн.

Работы ведутся: Нет

Темп работ: С опережением

Не устранено замечаний: 0

из них критичные: 0

истек срок устранения: 0

Общее количество замечаний: 1

Количество выездов на объекты 12,01 тыс. ед.

Общее количество замечаний 1,16 тыс. ед.

ЗК-000003 Замечание куратора Устранено

Основное | История изменений

Объект контроля: [Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000 - км 7+100](#)

Объект посетил: [Трушкин С. Н.](#)

Дата и время посещения объекта: [20.07.2018 11:00](#)

Подрядчик: [ООО "ВРСК"](#)

Контракт: [№0825200001818000011-0402241-03 от 08.05.2018](#)

Суть замечания: Произвести ликвидацию колеиности на укрепленных обочинах, обеспечить дополнительную планировку обочин с последующим доуплотнением на км 0+000 км 5+000

Дата и время замечания: 20.07.2018 11:00



Устранить к: 10.08.2018 00:00

Дата и время фактического устранения: 26.07.2018 12:00

Предписание: -

Запись внес: [Трушкин С. Н.](#)

Прикрепленные файлы (2)

20180720_1145... 20180720_1145...



оперативный контроль ситуации на объекте кураторами



Сквозной контроль ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер км 0+000...

Виды работ по контрактам: [Выбрано: Все](#) [День](#) [Неделя](#) [Месяц](#) [Квартал](#) [Год](#) Поиск по наименованию

Виды работ | Ресурсы | Диаграмма | Ведомость объемов | Режим отображения: [Просмотр исполнения](#)

Структура работ	Наименование вида работ	Код	№ в смете	Основание	Ед. изм.	Сроки проведения/ Ответственный	Всего		2018		
							руб.	ед. изм.	руб.	ед. изм.	
Автомобильная дорога общего пользования регионального значения П... Раздел 1. Проезжая часть Раздел 2. Восстановление обочин	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения ...					08.05.18–31.10.18 Диденко Г. В.	План Факт	72 006 958,5 67 512 237,08	0 0	72 006 958,5 67 512 237,08	
	Раздел 1. Проезжая часть (ВР)	01				08.05.18–31.10.18	План Факт	65 817 295,33 65 817 295,33	0 0	65 817 295,33 65 817 295,33	
	Раздел 2. Восстановление обочин (ВР)	02				08.05.18–31.10.18	План Факт	1 694 919,84 1 694 941,75	0 0	1 694 919,84 1 694 941,75	
	Раздел 3. Устройство разметки (ВР)	03	30-01		км	08.05.18–31.10.18	План Факт	1 018 311,08 0	23,5135 0	1 018 311,08 0	
	Раздел 4. Устройство барьерных ограждений из стали на металли...	04	30-02		м	08.05.18–31.10.18	План Факт	3 043 439,5 0	1 159,7 0	3 043 439,5 0	
	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным п...	05	50-01		м2	08.05.18–31.10.18	План Факт	432 992,75 0	184,064 0	432 992,75 0	

детальный контроль ведомости и графика производства работ
+ формирование, согласование КС между подрядчиком и заказчиком + стройконтроль



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ



ЭТАЛОН

Сквозной контроль ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

- ✓ ведение дневника инженера-резидента
- ✓ замечания куратора
- ✓ решения штабов
- ✓ предписания
- ✓ связь с порталом подрядчика

The screenshot displays a software interface for managing construction issues. The main window is titled 'ЗК-000095 Замечание куратора' (Curator's Remark) and has a green 'Устранено' (Resolved) status. The interface includes a sidebar with 'Основное' (Main) and 'История изменений' (Change History) tabs. The main content area shows fields for 'Объект контроля', 'Объект посетил', 'Дата и время посещения объекта', 'Подрядчик', 'Контракт', and 'Суть замечания'. The 'Суть замечания' field contains the text: '5.Отсутствует бордюрный камень вдоль трамвайных путей в соответствии с рабочей документации от ПК 0+00 в направлении ул. К. Маркса. Работы по устройству асфальтобетона выполнены до головки рельса трамвайных путей.' Below this, there are fields for 'Дата и время замечания' (07.09.2018 10:27), 'Устранить к:' (21.09.2018 00:00), 'Дата и время фактического устранения', 'Предписание:', 'Запись внес:', and 'Прикрепленные файлы (2)'. Two PDF files are attached, with titles 'ответ на письмо...' and 'ответ_подрядчи...'. A smaller window titled 'Предписание № 6 от 10.09.2018' is overlaid on the main window, showing a table with columns for 'Основное', 'Фотографии', 'Прикрепленные файлы', and 'История изменений'. The 'Основное' tab is active, displaying fields for 'Кем выдано:', 'Номер:', 'Дата выдачи:', 'Работа:', 'Контракт:', 'Замечание куратора:', 'Источник:' (Эталон), 'Форма выдачи:' (Предписание), 'Расположение:' (-), 'Краткое содержание:' (repeating the text from the main window), and 'Статус:' (Выполнено).

детальный контроль ведомости и графика производства работ

+ формирование, согласование КС между подрядчиком и заказчиком + стройконтроль



Сквозной контроль ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИК – ПОДРЯДЧИК

Пакет документов № ДП-000030 На согласовании

Основное
Документы
История изменений

Сервер источника:
Подрядчик:
Контракт:
Объект контроля:

Отчетный период: 21.05.2018 - 07.08.2018
Стоимость работ, руб.: 11 574 959,84
Дата отправки: 08.08.2018 11:54
Дата получения: 08.08.2018 11:53
Срок согласования: 15.08.2018 11:54
Дата согласования: -
Срок полной оплаты: -
Дата полной оплаты: -
Замечания: -

Пакет документов № ДП-000030 На согласовании

Основное
Документы
История изменений

Начните вводить для поиска... Все документы

Дата	Название документа	Прикрепил
08.08.18	Исх. № 73-08 от 08.08.2018.pdf	
08.08.18	КС-2 №1 СВОДНАЯ.xlsx	
08.08.18	КС-2 №1.xlsx	
08.08.18	КС-2 №2.xlsx	
08.08.18	КС-2 №3.xlsx	
08.08.18	КС-2 №4.xlsx	
08.08.18	КС-2 №5.xlsx	
08.08.18	КС-3 № 1.xlsx	

электронный документооборот между подрядчиком и заказчиком
с контролем сроков, замечаний, статусов приемки выполнения и оплат



Сквозной контроль ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИК – ПОДРЯДЧИК

Пакет документов № ДП-000028 Отклонен

- Основное
- Документы
- История изменений

Сервер источника:	Ярославская область
Подрядчик:	ООО "Северный поток"
Контракт:	КТК №934521 от 28.04.2018 "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Ярославль - Тутаев"
Объект контроля:	И/д рег) Ремонт автомобильной дороги "Ярославль - Тутаев" - совхоз "Ярославка", км 0+021 - км - 2+459 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
Отчетный период:	06.07.2018 - 05.08.2018
Стоимость работ, руб.:	14 895 866,88
Дата отправки:	06.08.2018 19:42
Дата получения:	06.08.2018 19:41
Срок согласования:	13.08.2018 17:00
Дата согласования:	-
Срок полной оплаты:	-
Дата полной оплаты:	-
Замечания:	В комплекте исполнительной документации отсутствует исполнительная съемка продольного профиля, ведомость промеров поперечных уклонов и толщин. Отсутствуют лабораторные заключения качества органоминеральной смеси. Паспорта качества на битумную эмульсию и цемент не заверены подрядчиком. Расчет объема устройства траншеи и заполнения ЩПС С1 выполнен на ширину 0,6 м (по проекту 0,5 м), и на глубину засыпки 0,31 м (по проекту 0,25 м), эти отклонения линейных размеров от проектных ничем не обоснованы и с Заказчиком не согласованы, прроектная организация также не подтверждает обоснованность увеличения этих работ от проектных. В связи с этим акт на скрытые работы представителем Заказчика не подписан.

электронный документооборот между подрядчиком и заказчиком
с контролем сроков, замечаний, статусов приемки выполнения и оплат



Сквозной контроль ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный случай ГС-000047 от 03.04.2018
В работе

Основное

Документы

Автор: [Маркатох Сергей Викторович](#)

Контракт: [№Ф.2017.105895.7 от 11.04.2017 "выполнение работ по ремонту дорог в Центральном и Железнодорожном районах города Красноярска"](#)

Подрядчик: [ООО "ТК ДСУ"](#)

Описание: 1. Видимые разрушения бетонного бортового камня;
2. Восстановить целостность остановочных павильонов (3 шт)

Дата начала работы: 04.04.2018

Дата решения: -

Способ решения: -

Выполненные работы по гарантийному случаю: -

200 : Объекты Субъектов РФ

01.01.2018 - 31.12.2018

Нарушения по гарантийным случаям	23,23 %
% неустраненных нарушений по гарантийн...	23,23 %
Количество гарантийных случаев по об...	1,31 тыс. шт
Неустраненные нарушения по гарантийным...	305 шт

АКТ
о выявленных дефектах на объекте нахождения на гарантийном обслуживании

03.04.2018

Представитель Заказчика (МКУ «УДБ») *Давыдов Сергей Викторович*
и Представитель Подрядчика (ООО «ТК ДСУ») _____

прошли совместный осмотр объекта
ул. Лопуховская от ул. Мухоморова до ул. Революции

в соответствии с государственным контрактом от *11.04.2017 № ФФ.2017.105895.7*

По результатам осмотра установлено следующее:

№ п/п	Место выявления нарушения	Наименование нарушения (дефекта, замечания)
1		1. Видимые разрушения бетонного бортового камня
		2. Восстановить целостность остановочных павильонов (3 шт)

Выявленные дефекты устранить в срок *до 15 мая 2018*

Представитель Заказчика _____ *С.В. Давыдов*

Представитель Подрядчика _____





БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ




ЭТАЛОН

Сквозной контроль ОБЩЕСТВЕННЫЙ

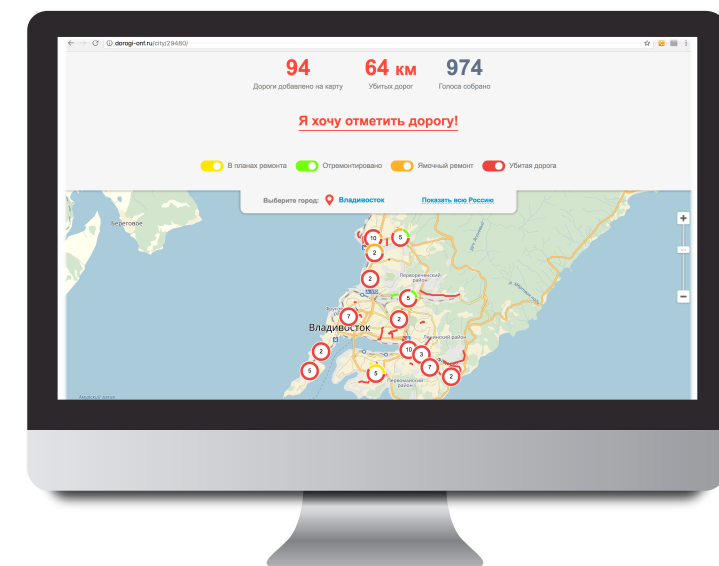

любая «ябида»
или региональный портал

API




маршрутизация
и доставка обращений
через транспортный сервис



ЭТАЛОН

учет всех обращений
по всем направлениям,
постановка задач на местах,
контроль отработки запросов
премодерация ответов

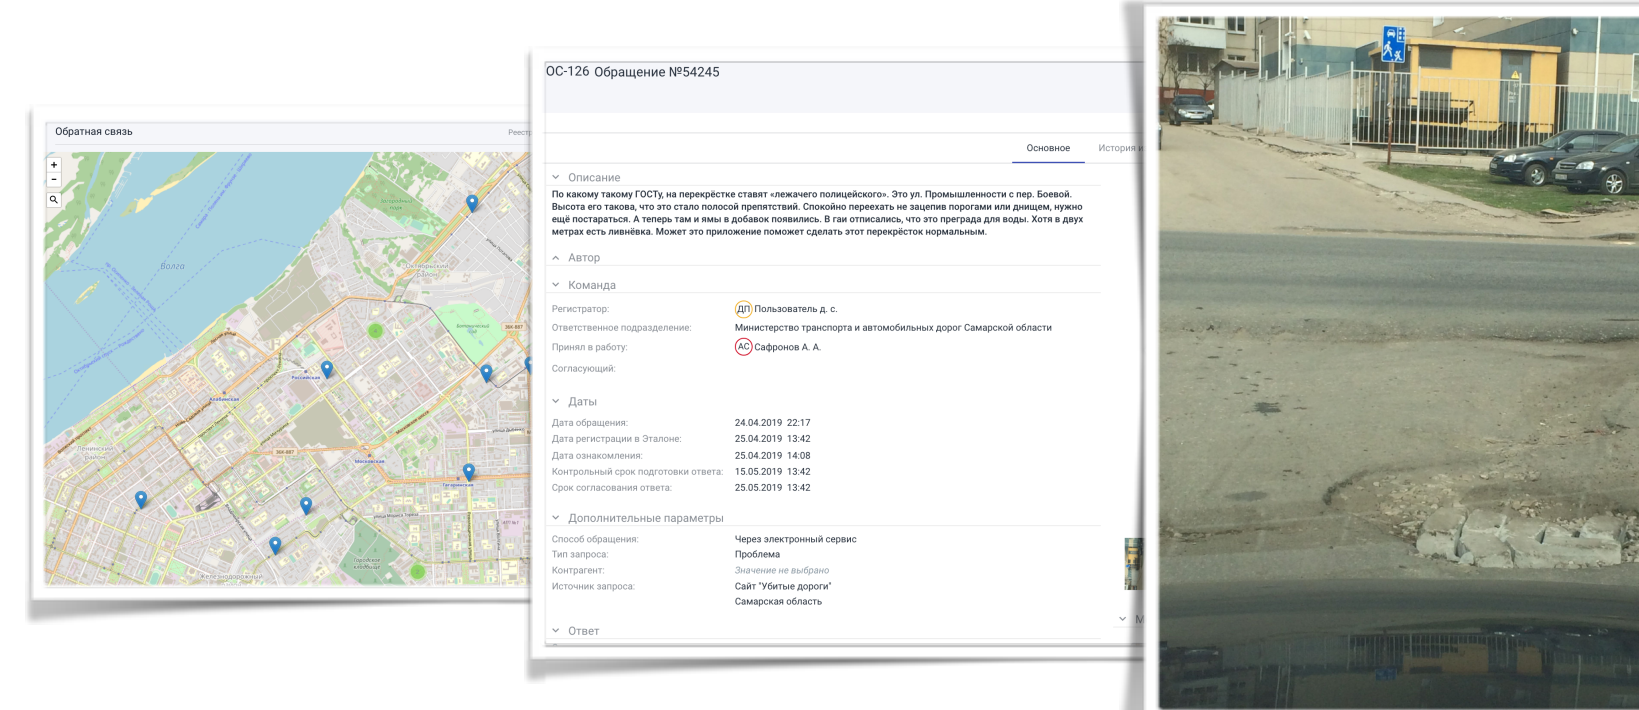



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

Сквозной контроль ОБЩЕСТВЕННЫЙ



ЭТАЛОН

ОС-63 Обращение №ВКД-683

[Вернуться в журнал](#)

ПОДГОТОВЛЕН ОТВЕТ



Основное

История изменений

Описание

Обращаются к Вам жители Железнодорожного района города Самары.

Хотели бы обратить Ваше внимание на ужасающее состояние отрезка улицы Дачной от улицы Пензенской до проспекта Карла Маркса. В течение последних 10 лет проходит застройка нашего микрорайона, на месте ветхих частных домов были построены новые многоэтажные дома, в настоящий момент застройка продолжается. А улица Дачная пребывает все в том же состоянии, что и десятки лет назад. Асфальтовое покрытие на улице отсутствует полностью, последние два года проезжая часть дороги засыпается асфальтовой крошкой. От такого покрытия только разносится пыль столбом в разные стороны, а после зимних морозов асфальтовая крошка сразу же разрушается, образуются многочисленные ямы, неровности. По дороге невозможно ездить. И это несмотря на то, что по улице Дачной очень интенсивное автомобильное движение, все сокращают путь и объезжают пробки через улицу Дачную, плюс к этому возле нашего дома находятся две автостоянки, автозаправка и автомойка.

Отдельный вопрос – как пешеходам передвигаться по улице Дачной?! Весной и осенью становится очень грязно, глина размывается, пройти по улице становится невозможным, люди идут рядом с машинами, пешеходные дорожки отсутствуют. Невозможно даже перейти с одной стороны улицы на другую, чтобы попасть в аптеку, в магазины. Здесь необходимо учесть, что ближайшая остановка общественного транспорта находится на улице Пензенской, чтобы дойти до нее, нужно как раз перейти улицу Дачную. Когда производили укладку асфальтовой крошки, пешеходные дорожки даже не были минимально засыпаны, там осталась все та же глина, невозможно перейти проспект Карла Маркса у дома № 30 по улице Дачной, чтобы пройти дальше.

Нужно отметить, что на участке от проспекта Карла Маркса до Московского шоссе улица Дачная уже давно благоустроена, проблема не сдвигается с места только на нашем участке.


Возникает вопрос: почему до сих пор нельзя решить вопрос с благоустройством небольшого участка улицы?! Это центр города, пересечение двух районов, а люди здесь ходят в грязи! Это же позор для нашего города!

Другая проблема, которую мы бы хотели Вам озвучить, это состояние внутриквартального проезда вдоль нашего дома. Данный проезд является единственной дорогой, через которую есть возможность выехать на улицу Киевскую, не объезжая улицу Тухачевского. Там ежедневно проезжают тысячи машин, людям негде ходить, они так же, как и по улице Дачной, идут рядом с автомобилями. Автомобильное движение очень интенсивное, в соседнем с нами доме находятся фитнес-клуб, магазины, кафе.


В настоящее время внутриквартальная дорога полностью разбита, образовались гигантские ямы, автомобили проваливаются в них, не работает ливневая канализация. Также хотелось бы отметить, что с открытием данного внутриквартального проезда минимального удобства для пешеходов предусмотрено не было, от дома № 55 по проспекту Карла Маркса вплоть до дома № 32 по проспекту Карла Маркса пешеходные дорожки отсутствуют. Здесь возникает второй вопрос: для чего было открывать движение по данному проезду, если в связи с открытием автомобильного движения так и не был решен вопрос с передвижением пешеходов?!

В 2018 году, в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу, в Самаре благоустраивается множество объектов, ремонтируются внутриквартальные дороги, благоустраиваются магистрали, улицы, микрорайоны. Улица Дачная же до сих пор представляет собой позорное пятно на карте Самары. Мы поняли, что вопрос со строительством магистрали «Центральная» в Железнодорожном районе отложен до неопределенного времени. Следовательно, ждать решения по вопросу благоустройства улицы Дачной в связи со строительством магистрали «Центральная» не стоит.

Местоположение

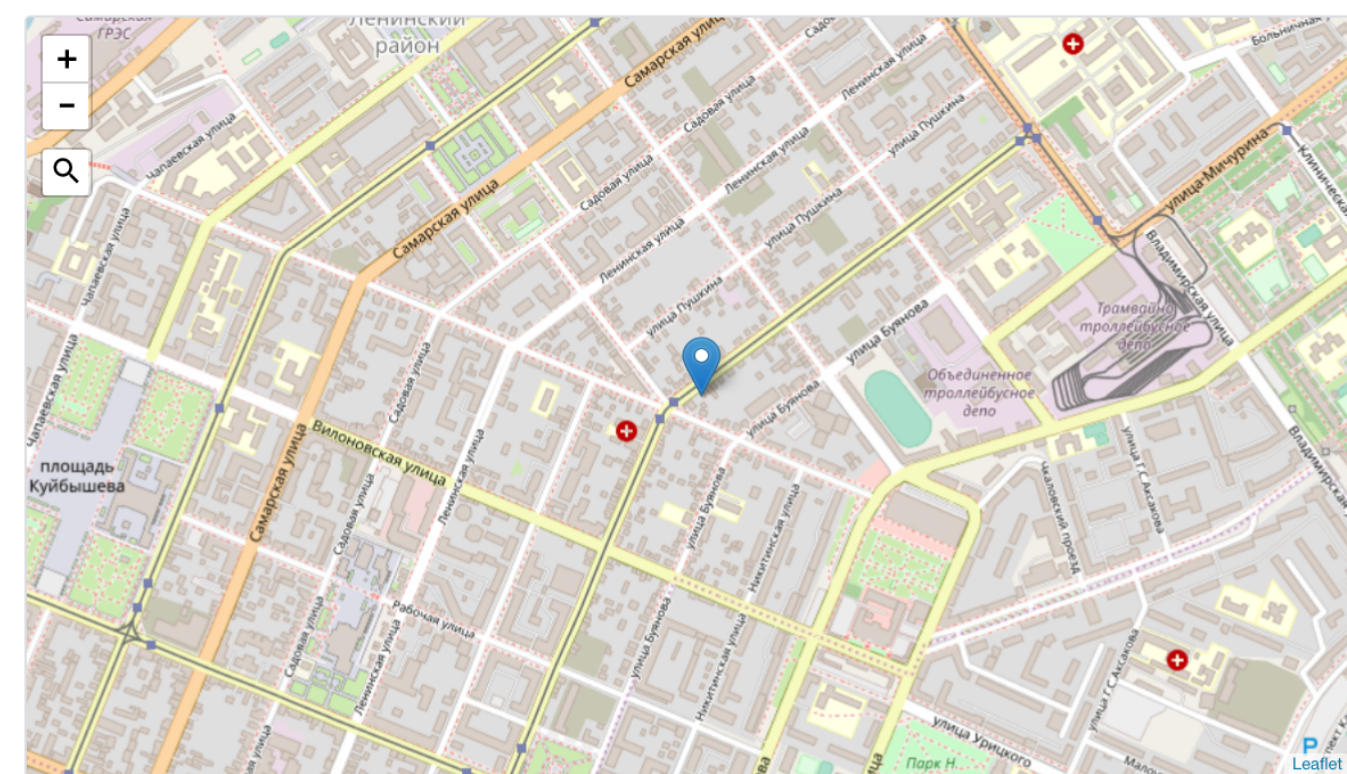

Вложения (0)

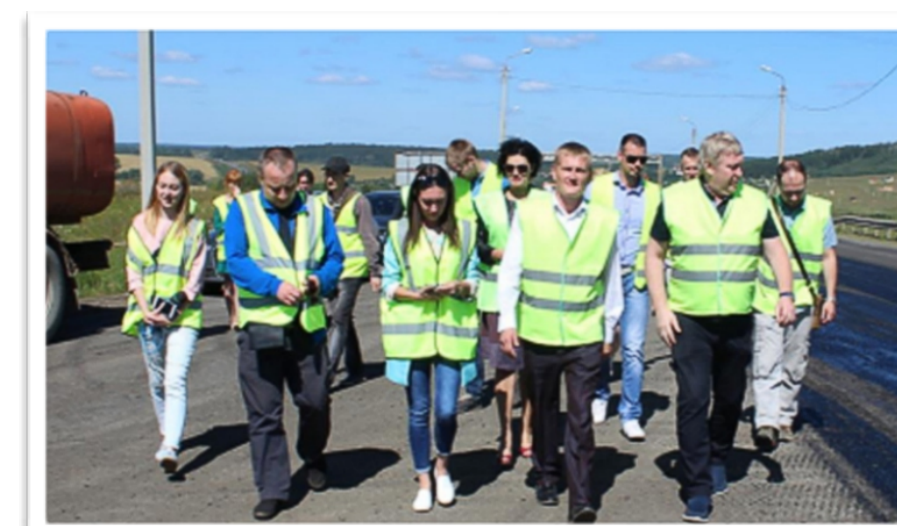





рабочий стол Самарской области

Ситуационный центр | **Оперативное управление** | Документооборот | Контроль | Организация деятельности | Справочники | Целевые программы

ЭТАЛОН | Начните вводить для поиска | Область поиска | Задать вопрос | Администратор с.

Рабочий стол

.Самара | .Самара_агл | .Саратов | .Саратов_агл | .Саха (Якутия) | .Саха(Якутия)_агл | .Сахалин | .Сахалин_агл | .Севастополь | .Севастополь_агл | .Сев.Осетия-Алания | .Сев.Осетия-Алания_агл

Самарская область | Дополнительные фильтры | за весь год | Обновить экран

Проблемы и обратная связь

Самара (рег. проблемы)	43
Самара Общ контроль + подрядчики	86

Паспорта объектов

Самара (Объекты 2017)	111
Самара (Объекты 2018)	86
Самара (Справочн.2018)	8
Самара (Объекты 2019)	178
Самара (Справочн.2019)	2

Задачи региональной группы

Самара (все задачи)	576
Самара (просрочка)	0
Самара (риски)	0

S-56 : Самарская область

01.01.2019 - 31.12.2019

Контракция объектов [Всего]	39 %
% законтрактованных объектов	39 %
Законтрактовано объектов	69 ед.
Количество объектов	176 ед.
Включено в план-график, объектов	176 ед.
% включенных в план-график объектов	100 %
Объявлены торги по объектам	176 ед.
% объявлены торги по объектам	100 %
Завершены торги по объектам	160 ед.
% завершены торги по объектам	91 %
Количество объектов без информации о торгах	0 ед.

Все объекты, кроме переходящих на след.год

01.01.2019 - 31.12.2019

Реализация объектов РП	0 %
% объектов РП, введенных в эксплуатацию	0 %
Количество объектов	174 ед.
Количество объектов, введенных в эксплуатац...	0 ед.
Количество объектов БКАД	173 ед.
Количество справочных объектов	1 ед.
% объектов БКАД, введенных в эксплуатацию	0 %
Протяженность дорог РП	221,97 км
Протяженность дороги, введенной в эксплуата...	0 км
Протяженность объектов БКАД	213,93 км
Протяженность объектов БКАД, введенных в э...	0 км
Протяженность справочных объектов	8,04 км
Протяженность справочных объектов, введенн...	0 км

S-56 : Самарская область

01.01.2019 - 31.12.2019

Освоение средств БКАД	1,7 %
% Оплаты от финансирования	1,7 %
Общее финансирование	4,71 млрд руб.
Контракты	469,97 млн руб.
План выполнения	1,12 млрд руб.
Выполнено	80,27 млн руб.
% Выполнения	7,15 %
Оплачено	80,27 млн руб.
% Оплаты от стоимости актов	100 %
Количество объектов	176 ед.

S-56 : Самарская область

01.01.2019 - 31.12.2019

Кассовое исполнение	100 %
% Оплаты от стоимости актов	100 %
Оплачено	80,27 млн руб.
Оплачено Федеральный бюджет	0 руб.
Оплачено (РБ+МБ)	80,27 млн руб.
Оплачено Региональный бюджет	72,56 млн руб.

все объекты, кроме переходящих на след.год

01.01.2019 - 31.12.2019

Укладка А/Бетон и др. типов покрытий	3,28 %
% укладки верхнего слоя (кв.м)	3,28 %
Площадь дороги	2,16 млн кв.м
Верхний слой, кв/м (по проекту)	638,08 тыс. кв.м
Верхний слой, кв/м (ФАКТ)	70,85 тыс. кв.м


S-56 : Самарская область

01.01.2019 - 31.12.2019

Общественный контроль	
% запросов с ответом	
Всего запросов	48 ед.



фрагмент карты с объектами Самарской области

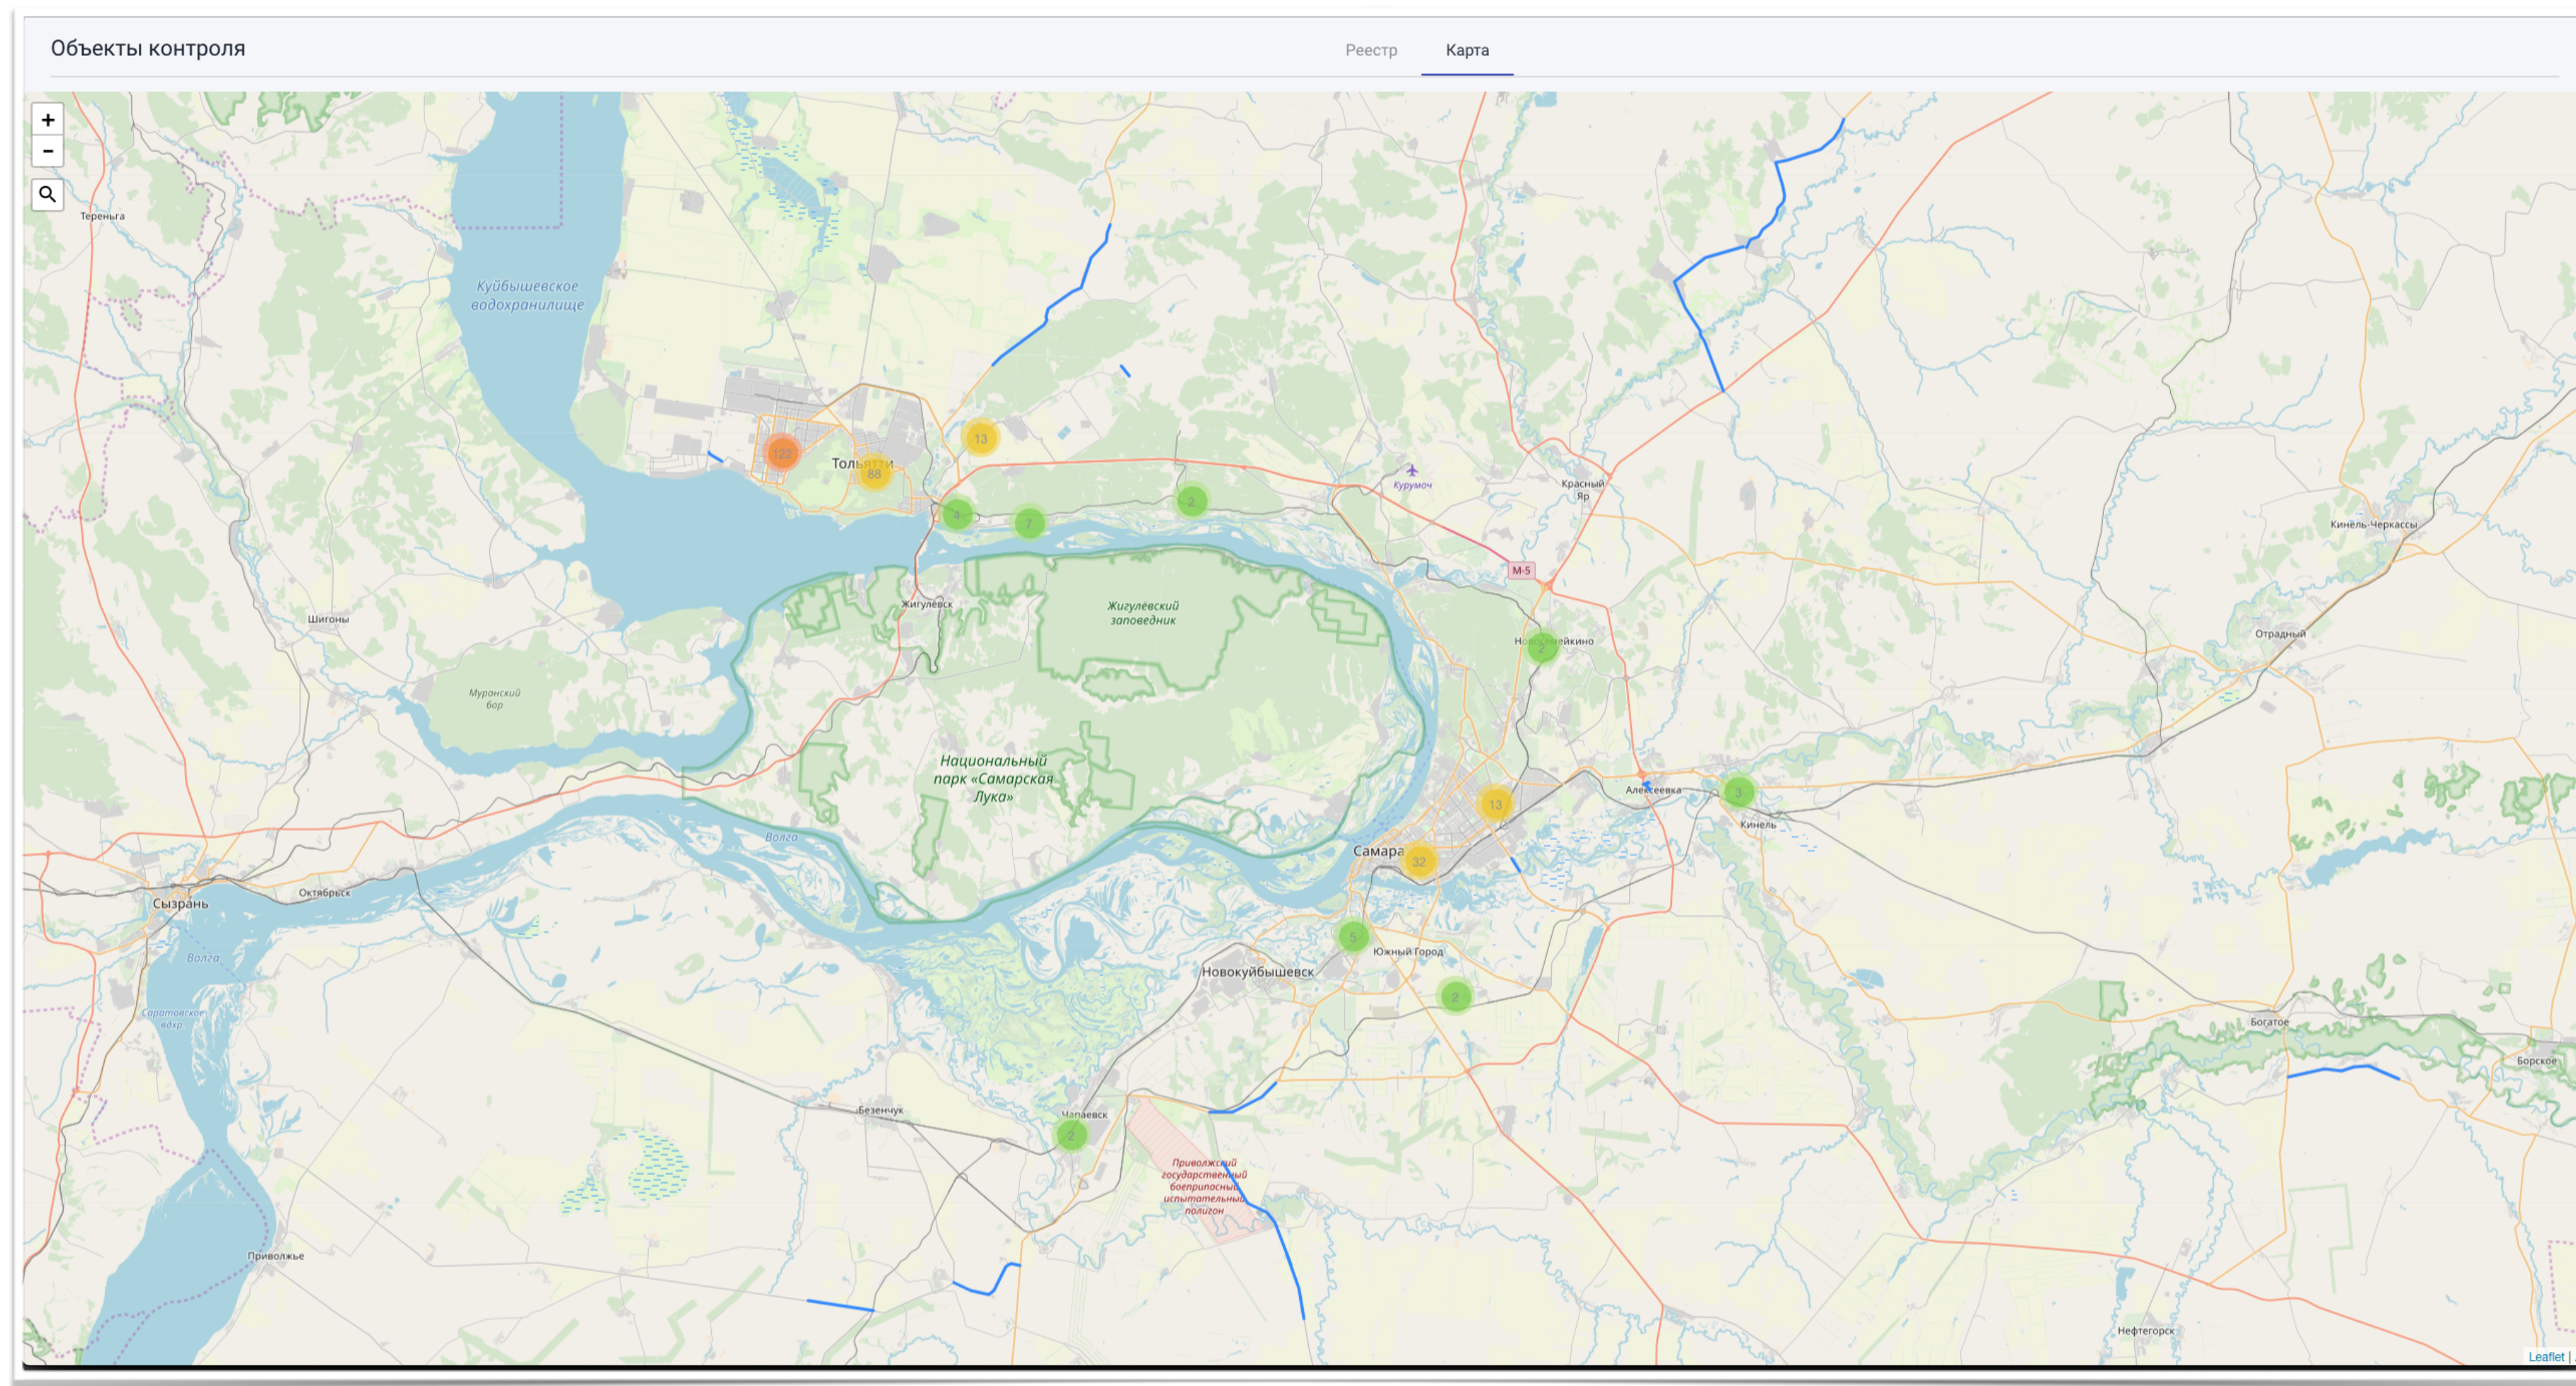




пример паспорта объекта Самарской области

Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы г.о. Тольятти

Внешний сервер:	Самарская область
Код объекта:	027-679
Идентификатор СКДФ:	-
Полное наименование:	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Тольятти по Ленинскому проспекту от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы
Характер работ:	Ремонт
Тип объекта контроля:	Дорожное строительство
Месторасположение объекта:	от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы
ОКТМО:	36000000 Муниципальные образования Самарской области
Автомобильная дорога:	Ленинский проспект
Значение объекта:	Местного значения
Основание для начала работ:	Муниципальная программа Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.

ЗК-000027 Замечание куратора Устранено

Объект контроля:	Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы г.о. Тольятти
Объект посетил:	Котов А. В.
Дата и время посещения объекта:	07.09.2018 17:00
Подрядчик:	ООО "Автодоринжиниринг"
Контракт:	№0842200002118000028_259977 от 16.04.2018
Суть замечания:	Отсутствует обратная засыпка, сломан бортовой камень, наличие излишек а/б на обочинах
Дата и время замечания:	07.09.2018 17:00
Устранить к:	21.09.2018 11:00
Дата и время фактического устранения:	21.09.2018 10:34
Предписание:	-
Запись внес:	Котов А. В.
Прикрепленные файлы (4)	 IMG_20180907_... IMG_20180907_... IMG_20180907_... IMG_20180907_...

Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы г.о. Тольятти

Заказчик:	Администрация городского округа Тольятти
Госэкспертиза утверждена:	-
Ген. подрядчик:	ООО "Автодоринжиниринг"
Готовность:	99,31%
Сроки выполнения:	16.04.2018 - 30.10.2018
Стоимость:	135 890 145,88 руб.
Запланирован на принципах КЖЦ:	Нет
Статус работ:	СМР
Объект сдан:	Да
Дата ввода в эксплуатацию:	10.10.2018
Дата окончания гарантийного срока:	10.10.2023
Справочный:	Нет
Статусы торгов по объекту	
Тип закупки:	44-ФЗ
Включен в план-график:	07.03.2018
Уникальный номер позиции плана-графика:	2018014230001000060000730001
Торги объявлены:	12.03.2018
Номер закупки:	0842200002118000028

